


水準点の記

水準点番号	茅7	水管 準理点者	茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市
所在地	茅ヶ崎市萩園2678番地		
敷地管理者	ナストーア株式会社	現況地目	宅地
標識の種類	金属標	埋設法	地上 (保護石4個)
水準点種類	1級水準点	設置年月日	平成23年12月27日
位置案内	国道1号産業道路入口交差点の北方約550mにナストーア(株)茅ヶ崎工場がある。		
	本点は同工場正門左手の敷地内にある。		

水準点詳細図

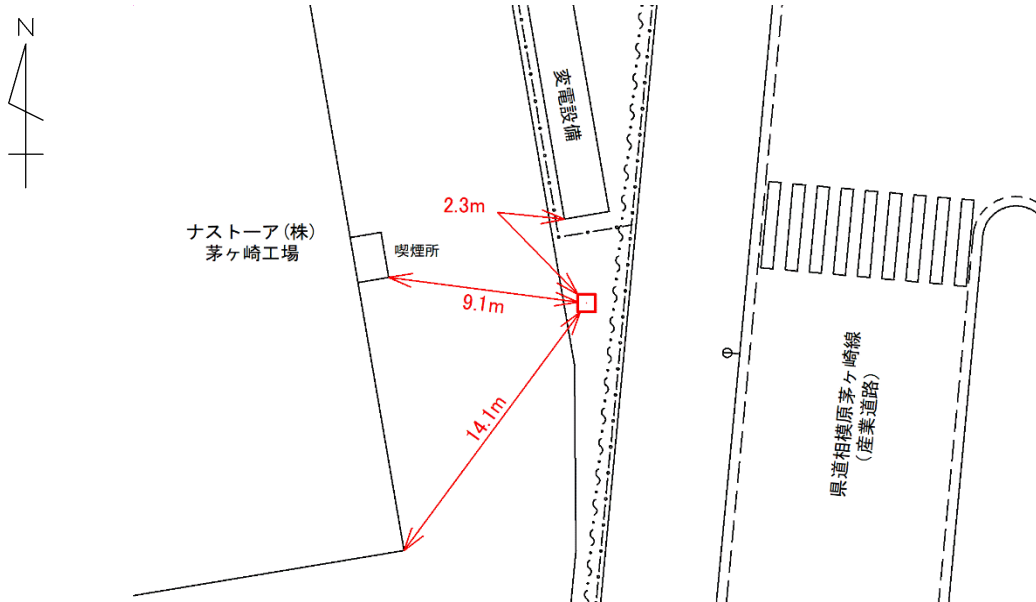

水準点案内図 S=1:25,000



写真



隣接点との距離

(茅8) 0.4km (茅7) 0.6km (39-1)

水準点の地上写真

撮影年月日 令和元年8月21日

標識番号	茅7
所在地	茅ヶ崎市萩園2678番地 (ナストア株)



備考：平成23年度 再設

水準測量成果表

水準点番号

第 7 号

観測の 基準日	海老名水準点を基準		国土地理院水準点を基準		備 考
	標高T. P (m)	変動量 (mm)	標高T. P (m)	変動量 (mm)	
S49. 1. 1	4.6998	—	4.6722	—	
50. 1. 1	4.6769	- 22.9	4.6703	- 1.9	
51. 1. 1	4.6843	+ 7.4	—	—	
51. 1. 1	4.6647	—	4.6651	- 5.2	S50年度改算
52. 1. 1	4.6639	- 0.8	4.6612	- 3.9	
53. 1. 1	4.6606	- 3.3	4.6549	- 6.3	
54. 1. 1	4.6641	+ 3.5	4.6624	+ 7.5	
55. 1. 1	4.6679	+ 3.8	4.6641	+ 1.7	
56. 1. 1	4.6561	- 11.8	4.6640	- 0.1	
57. 1. 1	4.6633	+ 7.2	4.6646	+ 0.6	
58. 1. 1	4.6650	+ 1.7	4.6692	+ 4.6	
59. 1. 1	4.6682	+ 3.2	4.6689	- 0.3	
60. 1. 1	4.6642	- 4.0	4.6665	- 2.4	
61. 1. 1	4.6584	- 5.8	4.6622	- 4.3	
62. 1. 1	4.6553	- 3.1	4.6570	- 5.2	
63. 1. 1	4.6514	- 3.9	4.6553	- 1.7	
64. 1. 1	4.6513	- 0.1	4.6511	- 4.2	
H2. 1. 1	4.6459	- 5.4	4.6473	- 3.8	
3. 1. 1	4.6427	- 3.2	4.6435	- 3.8	
4. 1. 1	4.6434	+ 0.7	4.6420	- 1.5	
5. 1. 1	4.6414	- 2.0	4.6422	+ 0.2	
6. 1. 1	4.6512	+ 9.8	4.6527	+ 10.5	
7. 1. 1	4.6415	- 9.7	4.6433	- 9.4	
8. 1. 1	4.6503	+ 8.8	4.6494	+ 6.1	
9. 1. 1	4.6445	- 5.8	4.6452	- 4.2	
10. 1. 1	4.6356	- 8.9	4.6392	- 6.0	
11. 1. 1	4.6325	- 3.1	4.6327	- 6.5	
12. 1. 1	4.6352	+ 2.7	4.6342	+ 1.5	
13. 1. 1	4.6356	+ 0.4	4.6340	- 0.2	
14. 1. 1	4.6321	- 3.5	4.6331	- 0.9	
15. 1. 1	4.6262	- 5.9	4.6281	- 5.0	
15. 1. 1	4.6108	—	4.6126	—	H14年度改算
16. 1. 1	4.6159	+ 5.1	4.6158	+ 3.2	
17. 1. 1	4.6087	- 7.2	4.6078	- 8.0	

()は、I 39-1を基準として計算したものである。

水準測量成果表

水準点番号

第 7 号

観測の 基準日	海老名水準点を基準		国土地理院水準点を基準		備 考
	標高T. P (m)	変動量 (mm)	標高T. P (m)	変動量 (mm)	
18. 1. 1	3.4548	—	3.4575	—	H17年度仮点
19. 1. 1	3.5393	—	3.5409	—	H18年度仮点
20. 1. 1	3.5347	- 4.6	3.5342	- 6.7	
21. 1. 1	3.5362	+ 1.5	3.5362	+ 2.0	
22. 1. 1	3.5201	—	3.5210	—	H21年度仮点
23. 1. 1	3.5163	- 3.8	3.5130	- 8.0	
24. 1. 1	4.1388	—	4.1385	—	測地成果2011 H23年度改埋
25. 1. 1	4.1346	- 4.2	4.1339	- 4.6	
26. 1. 1	(4.1342)	(- 0.4)	4.1340	+ 0.1	
27. 1. 1	—	—	—	—	
28. 1. 1	—	—	4.1244	- 9.6	
29. 1. 1	—	—	—	—	
30. 1. 1	—	—	4.1212	- 3.2	
31. 1. 1	—	—	—	—	
R2. 1. 1	—	—	4.1136	- 7.6	
R3. 1. 1	—	—	—	—	
R4. 1. 1	—	—	4.1061	- 7.5	
R5. 1. 1	—	—	—	—	
R6. 1. 1	—	—	4.1049	- 1.2	

()は、I 39-1を基準として計算したものである。
