

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想特定事業計画

令和4年度進捗管理シート

—目 次—

公共交通特定事業	1
道路特定事業	6
交通安全特定事業	34
建築物特定事業	35
都市公園特定事業	70
その他事業	73



※本資料は令和5年3月31日時点のものである。

【推進管理シート】公共交通特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号：公共交通—1

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	JR茅ヶ崎駅																	
2. 事業主体	すべて	東日本旅客鉄道(株)																	
3. 事業区間	道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市元町1丁目																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画														事業実施状況		
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容				規模		実施時期								事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期			
改札内通路	注意喚起等の案内表示を設置するなど安全に通行できるように配慮する。	随時対応・定期実施	—	—	計画														
					変更														
					実績														
自由通路 (改札外コンコース)	改札周辺における十分な空間を確保する。	短期	—	—	計画													平成27年度に実施済み。	●
					変更														
					実績														
自由通路 (改札外コンコース)	自然光を取り込み、明るく集える空間等を整備する。	短期	—	—	計画													平成27年度に実施済み。	●
					変更														
					実績														
ホーム	可動式ホーム柵の設置に向け、構造や運用等の課題解決を検討する。	長期	—	—	計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
エレベーター	駅設備の改修に合わせて、かごの拡大等を検討する。	長期	1	基	計画													老朽更新時期調整ならびご利状況によるため	
					変更														
					実績														
多機能トイレ	ベビーベッドの出っぱなしを禁止する案内表示を設置する。	実施時期・方法検討中	1	箇所	計画													平成27年度に実施済み。	●
					変更														
					実績														
多機能トイレ	多機能トイレの開閉ボタンに点字を設置する。	実施時期・方法検討中	1	箇所	計画													平成29年度に実施済み。	●
					変更														
					実績														
多機能トイレ	駅設備の改修に合わせて、多目的シートの設置を検討する。	長期	1	箇所	計画													平成27年度に実施済み。	●
					変更														
					実績														
案内	駅改良・駅ビル増床にあわせ、案内サインを改修する。(エレベーターの設置位置等)	短期	—	—	計画													平成27年度に実施済み。	●
					変更														
					実績														
心のバリアフリー	駅社員による案内やサポートなどの対応を充実する。	随時対応・定期実施	—	—	計画														継続
					変更														
					実績														
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について駅社員及び乗務員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	—	—	計画														継続
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			混雑時の安全対策や駅利用者へのエレベーターや多機能トイレなどの利用ルール啓発																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<p>(改札周辺における十分な空間を確保する。) (自然光を取り込み、明るく集える空間等を整備する。)</p>  <p>整備前 → 整備後</p> <p>(駅改良・駅ビル増床にあわせ、案内サインを改修する。)</p>  <p>整備前 → 整備後</p>																

【推進管理シート】公共交通特定事業

番号：公共交通—2

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	JR北茅ヶ崎駅																	
2. 事業主体	すべて	東日本旅客鉄道(株)																	
3. 事業区間	道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎3丁目																	
6. 事業計画及び事業実施状況	すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況							
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模	実施時期	事業に関する補足や検討状況、変更点など													完了
項目	事業内容	実施時期				数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	
全体	市と連携し、橋上駅舎化とそれに併せた駅舎のバリアフリー化を検討する。	短期 中期	駅のバリアフリー化について、市と連携しコストダウン等に向けた検討を実施する。あわせて、内方線付点状ブロックの整備の検討を実施する。	—	—	計画											令和元年度に内方線付点状ブロックの整備完了。バリアフリー化は、昨年度実施設計の着手時期が見直しとなったが、事業の実施に向けて市の考え方を提示いただきたい。		
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について駅社員及び乗務員の教育を実施する。	随時対応・ 定期実施	サービス介助士の資格取得を推進し、きめ細やかなサービスの提供に努める。また、資格を取得した社員を中心に各職場で勉強会を実施する。	—	—	計画												継続	
心のバリアフリー	駅社員による案内やサポートなどの対応を充実する。	随時対応・ 定期実施	案内やサポートなどの対応を充実する。	—	—	計画												平成27年度に駅遠隔操作対応に変更。	継続
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等	エレベーター設置等による出入口からホームまでのバリアフリー化された経路の確保に向けた検討を進める。																		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】公共交通特定事業

番号：公共交通—3

特定事業等の実施時期凡例

【短期】H27～29年度に実施する事業 【中期】H30～R4年度に実施する事業 【長期】R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 【実施時期・方法検討中】R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 【随時対応・定期実施】随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	路線バス																	
2. 事業主体	すべて	神奈川中央交通（株）																	
3. 事業区間	道路管理者	—																	
4. 道路延長（m）	道路管理者	—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	—																	
6. 事業計画及び事業実施状況	すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画											事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可													事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了				
項目	事業内容	実施時期	具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
				数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
茅ヶ崎駅北口駅前広場	案内表示を多言語化する。	長期	案内表示を多言語化する。	—	—	計画												現在、茅ヶ崎市公共サインガイドラインに則り、日本語と英語で表記。案内板更新時（未定）に他の言語の追加について、茅ヶ崎市と協議する。	
車両	ノンステップバスを導入する。	随時対応・定期実施	車両の代替えに合わせ、順次ノンステップバスの導入を行う。	0	両	計画												平成27年度：7両導入（代替、移籍含む） 平成28年度：0両導入→29年度に統合 平成29年度：12両導入（累計） 平成30年度：5両導入 令和元年度：9両導入 令和2年度：0両導入 令和3年度：0両導入 令和4年度：0両導入 令和5年度：2両導入予定 ※R2年度は新型コロナウイルスの影響によるもの	継続
車両	インターホン設置に関する案内表示を改善する。	短期	インターホン設置に関する案内表示を改善する。	0	両	計画												新車導入時にインターホン付近にイラストシール貼り付け。今後継続的に実施。 平成29年度：12両実施 平成30年度：5両実施 令和元年度：9両実施 令和2年度：実施なし（新車導入なし） 令和3年度：実施なし（新車導入なし） 令和4年度：実施なし（新車導入なし）	
バス停留所	道路管理者や沿道と協議して、安全な待合空間を確保する。	随時対応・定期実施	道路管理者や自治体と協力し、安全な待合空間を確保する。	—	—	計画													継続
バス停留所	車外マイクを活用した行先の周知を徹底する。	随時対応・定期実施	車外マイクを活用した行先の周知を徹底する。	—	—	計画												利用者への適切な対応について、継続的に指導・教育を実施。（月次教育等で実施）	継続
バス停留所	道路管理者や市と連携し、バス停の利用環境の向上に努める。	長期	道路管理者や自治体と協力し、バス停の利用環境の向上に努める。	—	—	計画													
バス停留所	市と連携して、車いすで乗降しやすいバス停のガイドマップを作成する。	中期	市と調整を行い、車いすで乗降しやすいバス停のガイドマップを作成する。	—	—	計画												茅ヶ崎市発行の「茅ヶ崎市バス路線図」に「車いすで乗降可能な停留所」を追記。	●
バス停留所	バス停の時刻表にノンステップバスによる運行を表示する。	長期	バス停の時刻表にノンステップバスによる運行を表示する。	—	—	計画												現在、お客様向けのバスロケーションシステムでノンステップ車両を表示している。	
バス停留所	バス接近表示システムを導入する。（音声案内・電光掲示）	長期	市と調整・協議し、バス接近表示システムを導入する。（音声案内・電光掲示）	—	—	計画												・平成29年3月にJR茅ヶ崎駅南北自由通路にバス運行情報表示機を設置。（南口側）（茅ヶ崎市、藤たまや、当社の三者で協議） ・令和元年6月にJR茅ヶ崎駅南北自由通路北側柱部分にバス運行情報表示機を設置。（北口側）（茅ヶ崎市、藤アルバック、当社の三者で協議）	
バス停留所	道路管理者と連携して、バス停にベンチ・上屋を設置する。	長期	市と調整・協議し、バス停にベンチ・上屋を設置する。	—	—	計画													
案内	中央の乗降口付近などわかりやすい位置に筆談具設置を示す案内表示を設置する。	短期	中央の乗降口付近などわかりやすい位置に筆談具設置を示す案内表示を設置する。	—	—	計画												新型コロナウイルスの影響もあるため、経営状況により、再度検討する。	
案内	ピクトグラム等の導入など、優先席と一般席のシートの違いがわかるようにする。	中期	ピクトグラム等の導入など、優先席と一般席のシートの違いがわかるようにする。	0	両	計画												平成27年度：7両実施 平成28年度：14両実施 平成29年度：14両実施 平成30年度：11両実施 令和元年度：19両実施 令和2年度：実施なし 令和3年度：実施なし 令和4年度：実施なし ※R2年度は新型コロナウイルスの影響によるもの	
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施する。	—	—	計画												利用者への適切な対応について、継続的に指導・教育を実施。（月次教育等で実施）	継続
心のバリアフリー	バス停への正着やニーリングを徹底する。	随時対応・定期実施	バス停への正着やニーリングを徹底する。	—	—	計画												利用者への適切な対応について、継続的に指導・教育を実施。（月次教育等で実施）	継続
心のバリアフリー	高齢者、障害者等への座席の譲り合いについて乗客への声かけを実施する。	随時対応・定期実施	高齢者、障害者等への座席の譲り合いについて乗客への声かけを実施する。	—	—	計画												利用者への適切な対応について、継続的に指導・教育を実施。（月次教育等で実施）	継続
心のバリアフリー	ベビーカーの固定方法やその説明をわかりやすく改善する。	短期	ベビーカーの固定方法やその説明をわかりやすく改善する。	—	—	計画												該当座席付近に使用方法や注意事項を記載した案内のシールを貼付。	●
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			低床車両の導入やバス停の利用環境の向上については、事業者単体で進めていくことは難しいため、バス事業者と市とともに協力しながら進めていく必要がある。																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】公共交通特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号：公共交通—4

項目		該当事業者	記入欄																	
1. 施設名、路線名	すべて		コミュニティバス																	
2. 事業主体	すべて		茅ヶ崎市																	
3. 事業区間	道路管理者		—																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者		—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等		—																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況							
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了			
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-			検討中	随時・定期	
茅ヶ崎駅北口駅前広場	バス乗降場の案内表示を多言語化する。	中期	バス乗降場の案内表示を多言語化する。	—	—	計画												地域公共交通計画策定に伴うバス路線の見直しと同時に実施予定。		
茅ヶ崎駅南口駅前広場	バス停の屋根を改良する。(道路管理者と連携して検討)	短期	バス停の屋根を改良する。(道路管理者と連携して検討)	—	—	計画												南口整備に合わせ令和5年度以降実施予定		
車両	電光掲示や音声等による車内案内を充実する。(路線図、多言語化、ふりがな等)	長期	電光掲示や音声等による車内案内を充実する。(路線図、多言語化、ふりがな等)	—	—	計画												車内運賃表示機を液晶画面のものに入れ替え、誰にも見やすい物にした。	●	
バス停留所	道路管理者や沿道と協議して、安全で乗降しやすい待合空間の環境整備を行う。(停留所移設や柱の埋め込み等)	随時対応・定期実施	道路管理者や沿道と協議して、安全で乗降しやすい待合空間の環境整備を行う。(停留所移設や柱の埋め込み等)	—	—	計画												平成27年度：2基(移設) 平成28年度：1基(移設) 平成29年度：2基(移設) 平成30年度：1基(移設)+4箇所鉄砲道 令和2年度：1基(移設)	継続	
バス停留所	時刻表を点字で表記する。	実施時期・方法検討中	時刻表を点字で表記する。	—	—	計画														
バス停留所	停留所の案内板や路線案内図を見やすく、わかりやすいものに改善する。	短期	停留所の案内板や路線案内図を見やすく、わかりやすいものに改善する。	—	—	計画													継続	
バス停留所	駅改札から停留所まで連続した案内表示を設置する。(ペDESTリアンデッキなど)	短期	駅改札から停留所まで連続した案内表示を設置する。(ペDESTリアンデッキなど)	—	—	計画													継続	
バス停留所(市立病院)	見やすく、わかりやすい乗換案内の表示を設置する。	短期	見やすく、わかりやすい乗換案内の表示を設置する。	—	—	計画														
案内	乗降口付近などのわかりやすい位置に筆談具設置を示す案内表示を設置する。	短期	乗降口付近などのわかりやすい位置に筆談具設置を示す案内表示を設置する。	—	—	計画													●	
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施する。(混雑時の乗客への声かけや対応方法など)	随時対応・定期実施	多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施する。(混雑時の乗客への声かけや対応方法など)	—	—	計画													継続	
心のバリアフリー	バス停への正着やニーリングを徹底する。	随時対応・定期実施	バス停への正着やニーリングを徹底する。	—	—	計画													継続	
心のバリアフリー	バス利用マナー等の啓発に関する車内掲示を行う。	短期	バス利用マナー等の啓発に関する車内掲示を行う。	—	—	計画													心のバリアフリーを啓発するポスターを車内に掲示した。	継続
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			コミュニティバスについては、運行事業者と市において協定を締結して事業を実施しており、運行計画案等は市が作成し、運行は運行事業者が担っている。また、バス停留所の待合空間における環境整備に関しては、道路管理者や交通管理者の理解と協力が不可欠である。上記より、多くの関係者が存在するため、丁寧に調整及び協議をしていく必要がある。																	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			・茅ヶ崎市バス路線図を作成し、民間バス及びコミュニティバスの垣根を越えて利便性向上を図った。 ・働き方の見直しや運転手不足に対応するため、事業のスリム化を図る必要がある。しかし、さらなる高齢化等により公共交通の役割は増すものと考えられ、必要な部分には経費を充てていくことを検討しなければならない。																	

【推進管理シート】公共交通特定事業

番号：公共交通—5

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	タクシー																
2. 事業主体		すべて	一般社団法人神奈川県タクシー協会																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画											事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-			検討中	随時・定期
車両	ユニバーサルデザインタクシーを導入する。	随時対応・定期実施	ユニバーサルデザインタクシーを導入する。	—	—	計画												UDタクシー21両、福祉車両6両を稼働させています。	継続
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施する。	—	—	計画												UDタクシーの乗務員にUDドライバー研修を受講させています。	継続
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			参考写真	UDタクシー					ウェルキャブ仕様のタクシー										
																			
								<small>後席回転シート仕様も手動車いす専用収納装置（電動式・ガードマット付）</small>											

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—1

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路1) 国道1号																
2. 事業主体		すべて	国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所																
3. 事業区間		道路管理者	一里塚交差点～十間坂交差点																
4. 道路延長(m)		道路管理者	600m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画														事業実施状況		
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-			検討中	随時・定期
茅ヶ崎駅前交差点地下道	市と協議のうえ、地下道通路部の歩行者と自転車の通行位置の明示について検討する。	実施時期・方法検討中	—	—	計画													地下道管理者である茅ヶ崎市で対応・施工予定のため、事業内容を削除。	
茅ヶ崎駅前交差点地下道	民地出入口と高さ調整をしたうえ、中央病院側の歩道の横断勾配を改善する。	短期	1	箇所	計画													H29年2月完了	●
自転車走行環境	交通管理者及び市と連携し、自転車通行帯への誘導方法について検討をする。	随時対応・定期実施	—	—	計画														継続
自転車走行環境	市の自転車ネットワークと整合を図り、交通管理者と協議のうえ、交差点付近における矢羽根設置の可否を検討する。	実施時期・方法検討中	400	m	計画													安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会(国土交通省・警察庁で開催)における「『自転車ネットワーク計画策定の早期進展』と『安全な自転車通行空間の早期確保』に向けた提言」を受け関係機関で調整。	継続
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—																

 番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—2

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																	
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路3) 県道45号(茅ヶ崎中央通り)																	
2. 事業主体		すべて	神奈川県藤沢土木事務所																	
3. 事業区間		道路管理者	茅ヶ崎駅前交差点～ちがさき市民活動サポートセンター																	
4. 道路延長(m)		道路管理者	470m																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画														事業実施状況			
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了	
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期				
歩行空間	歩道の十分な幅員を確保する。	実施時期・方法検討中	37	m	計画													茅ヶ崎市役所庁舎建て替え工事に伴い、文化会館に向かう階段を挟んだ市役所側にも歩行空間が整備されていることから、トータルとしては十分な歩道幅員が確保できている。	●	
歩行空間	歩道の横断勾配を改善する。(基準不適合箇所の改修を検討)	短期	必要	箇所	計画														●	
歩行空間	歩道のがたつきを改善する。	短期	必要	箇所	計画														今後も定期的なパトロールや点検等により、適宜必要な維持修繕を行う。	●
					計画															
					変更															
					実績															
					計画															
					変更															
					実績															
					計画															
					変更															
					実績															
					計画															
					変更															
					実績															
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—																	

 事業予定区間・箇所を位置図に整理

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—3

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	(主要経路4) 県道309号(茅ヶ崎中央通り)																	
2. 事業主体	すべて	神奈川県藤沢土木事務所																	
3. 事業区間	道路管理者	茅ヶ崎駅前広場～茅ヶ崎駅前交差点																	
4. 道路延長(m)	道路管理者	140m																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	—																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画												事業実施状況				
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期			
歩行空間	JIS規格に適合し、周囲との色の差がはっきりした視覚障害者誘導用ブロックに改修する。	短期	280	m	計画													JIS規格に適合した視覚障害者誘導用ブロックに計画的に改修する。	
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

 事業予定区間・箇所を位置図に整理

【推進管理シート】道路特定事業


番号：道路—4

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R2年度に実施する事業 [長期]R3年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R2年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																	
1. 施設名、路線名		すべて	(補完経路1) 県道310号(雄三通り)																	
2. 事業主体		すべて	神奈川県藤沢土木事務所																	
3. 事業区間		道路管理者	茅ヶ崎駅南口広場～茅ヶ崎駅南口入口交差点																	
4. 道路延長(m)		道路管理者	1,228m																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画												事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了	
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期				
歩行空間	交通管理者・茅ヶ崎市と連携し、経路の実状に合わせた可能な交通安全対策を検討する。	実施時期・方法検討中	必要	箇所	3														交通管理者・茅ヶ崎市と連携し、沿道土地利用の実状に合わせた可能な交通安全対策を検討する。	
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—																	

県道等：事業予定区間・箇所位置図

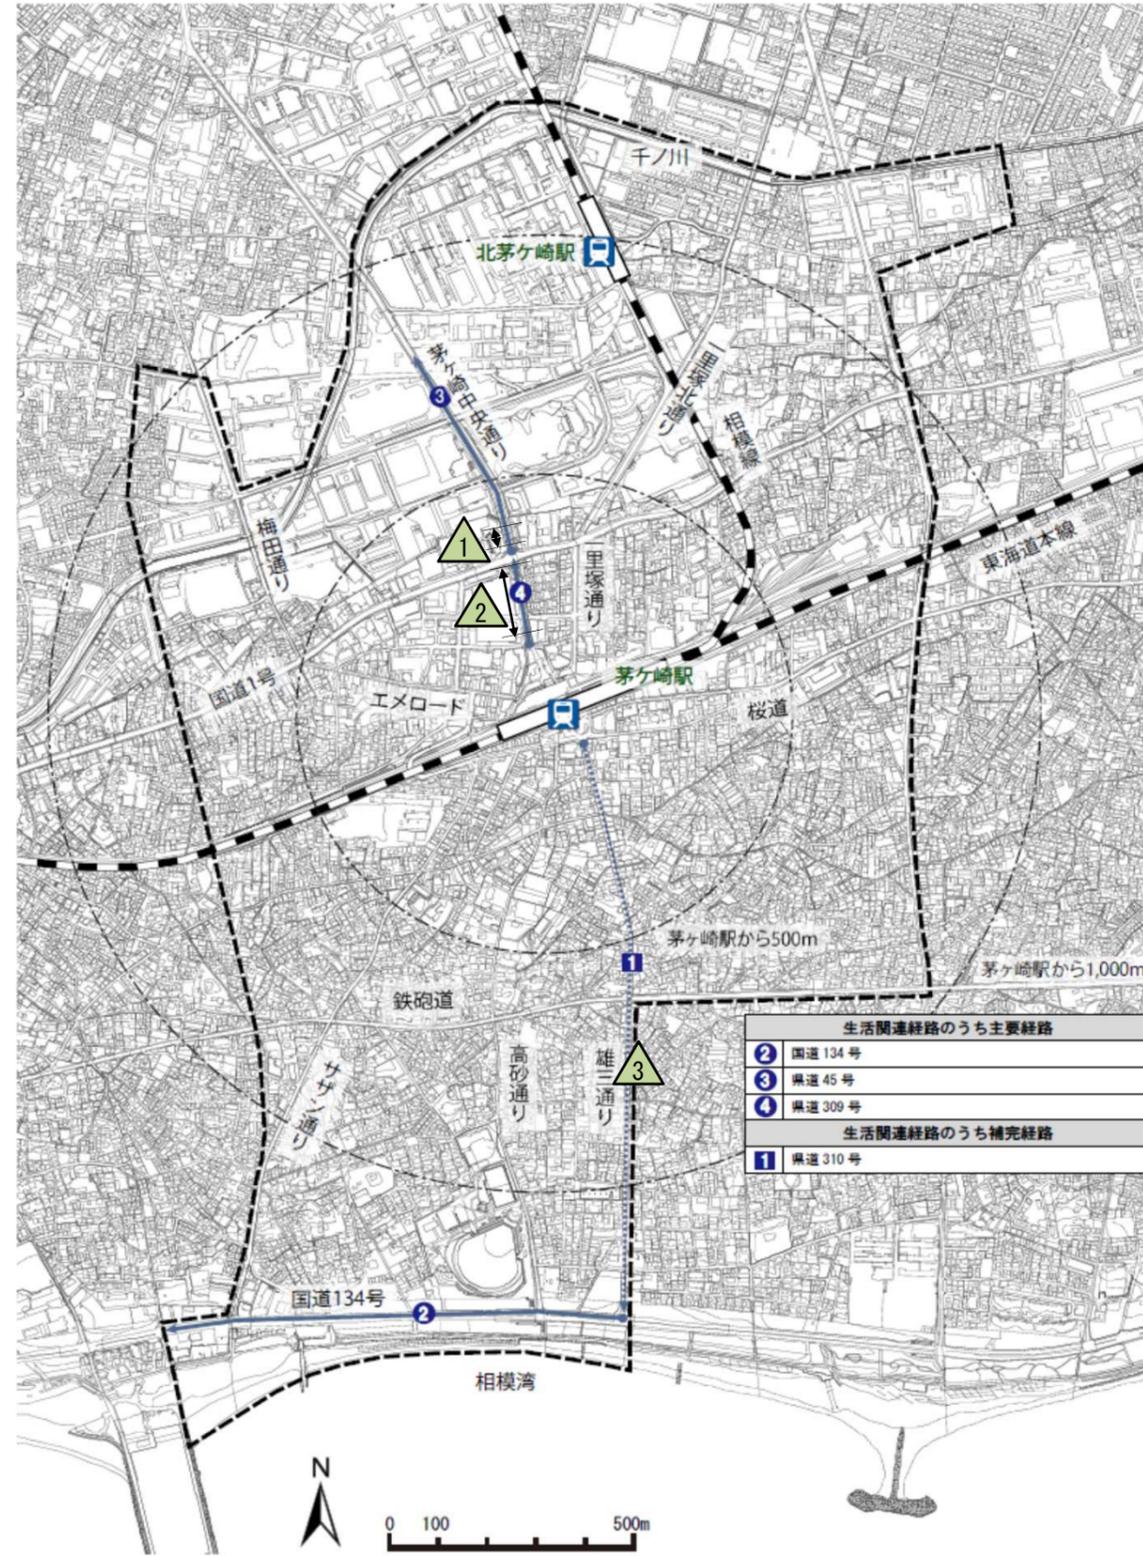

【推進管理シート】道路特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号：道路—5

項目		該当事業者	記入欄														
1. 施設名、路線名	すべて		茅ヶ崎駅北口駅前広場														
2. 事業主体	すべて		茅ヶ崎市														
3. 事業区間	道路管理者		茅ヶ崎駅北口駅前広場														
4. 道路延長 (m)	道路管理者		—														
5. 所在地	建築物所有者・管理者等		—														
6. 事業計画及び事業実施状況	すべて		茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況				
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期						事業に関する補足や検討状況、変更点など			完了	
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期	
歩行空間 (デッキを含む)	視覚障害者誘導用ブロックを改修し、周囲の路面の色との輝度比を確保する。	長期	190	㎡	計画												令和3年度中に完了見込がないため、実施時期の見直しを図る。
歩行空間 (デッキを含む)	舗装の適切な維持管理に努め、適宜修繕を行う。	随時対応・定期実施	—	—	計画												継続
歩行空間 (デッキを含む)	放置自転車等の撤去を実施するとともに、地域や交通管理者等と連携し、自転車利用者への啓発活動を行う。	随時対応・定期実施	—	—	計画												茅ヶ崎市自転車等の放置防止に関する条例及び施行規則に基づき実施。
タクシー乗降場	視覚障害者誘導用ブロックの配置を改善する。	長期	1	箇所	計画												タクシー乗り場に限らず、バス乗り場についても改善した方が良い箇所が見受けられるため、一括して改善していく方向で検討中。
自家用車乗降場・駐車場	障害者用停車施設の不適切な利用を抑制するため、路面をカラー表示するとともに、茅ヶ崎市公共サインガイドラインを参考とした看板設置を行う。	短期	1	箇所	計画												平成30年度中に事業実施できなかったため実施時期の見直しを図る。
エレベーター	エレベーターの改修に併せて電車の始発及び終電時間を考慮したエレベーター稼働時間の検討をする。	長期	1	基	計画												平成27年11月16日より1号機（三井住友銀行前エレベーター）について24時間運転を実施した。
エレベーター	ボタンの表示方法を検討し改善する。	中期	5	基	計画												平成28年度より実施する改修計画の中で実施時期を検討する。修繕計画により昇降機の改修を行っており、点検等から優先すべき修繕箇所が判明したため、計画を変更するもの。
エレベーター	銀行のエレベーターの使用について、地上階の案内表示の設置を検討する。	中期	1	箇所	計画												民間事業者設置のエレベーターであり、市で案内を行うべきか検討中。
エレベーター	定期点検の時間に関する事前周知を徹底する。	随時対応・定期実施	5	基	計画												屋外の施設のため、夜間の点検作業については実施が困難なため事前周知を徹底することとした。
案内	茅ヶ崎市公共サインガイドラインに基づき案内板の設置を見直す。	中期	必要	箇所	計画												平成27年度に図解サイン等の設計図、重点整備地区内のサイン配置案を検討し、平成28・30年度の2か年で、同地区のサインの新設・更新、見直しを行う。茅ヶ崎駅周辺のサイン整備を28・29年度としたため、予定を前倒しして、短期とした。
トイレ (共通)	触知案内図を設置する。(音声案内の設置は検討)	短期	1	箇所	計画												他施設の修繕に費用を要し実施できなかったため、トイレ周辺の状況を踏まえ設置時期の見直しを検討する。
多機能トイレ	緊急時の扉の開閉について、利用者に不安を感じさせない説明書きに改善する。	実施時期・方法検討中	1	箇所	計画												説明書きを掲示した。
多機能トイレ	オストメイト対応設備を設置する。	実施時期・方法検討中	1	箇所	計画												オストメイト対応設備を設置した。
多機能トイレ	開閉ボタンに点字を設置する。	短期	必要	箇所	計画												他施設の修繕に費用を要し実施できなかったため、設置時期の見直しを検討する。
心のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や歩道を狭める看板、商品陳列などへの指導を行い、適正な機能を確保する。	随時対応・定期実施	必要	箇所	計画												無許可での占用物については発見次第指導を実施している。
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—														
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			 <p>事業予定区間・箇所を位置図に整理</p>														

【推進管理シート】道路特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号：道路—6

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎駅南口駅前広場																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	茅ヶ崎駅南口駅前広場																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画														事業実施状況		
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期								事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了		
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期			
全体	バリアフリーに配慮した駅前広場を整備する。(安全な歩行空間や乗降場の整備等)	短期	1	施設	計画													南口整備に関する設計に着手した。	
歩行空間	放置自転車等の撤去を実施するとともに、地域や交通管理者等と連携し、自転車利用者への啓発活動を行う。	随時対応・定期実施	—	—	計画													茅ヶ崎市自転車等の放置防止に関する条例及び施行規則に基づき実施。	継続
歩行空間	「自転車は降りてください」の路面表示を改善するとともに、車止めを撤去する。	短期	必要	箇所	計画													駅前広場の改修のスケジュールを見直したため。	
歩行空間	舗装や視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持管理に努め、適宜修繕を行う。	随時対応・定期実施(中期～)	—	—	計画														継続
歩行空間	駅からバス・タクシー乗降場や障害者用停車施設まで連続した上屋設置を目指し整備する。	短期	1	施設	計画													駅前広場の改修のスケジュールを見直したため。令和3年度に一部実施。	
バス乗降場	バスが正着しやすい構造に改良する。	短期	1	施設	計画													駅前広場の改修のスケジュールを見直したため。	
バス乗降場	バス停車位置のレイアウト変更を検討し、バス乗降場からの安全な動線を確保する。	短期	1	施設	計画													駅前広場の改修のスケジュールを見直したため。	
タクシー乗降場	駅前広場の改修に合せ照明を整備する。	短期	1	施設	計画													駅前広場の改修のスケジュールを見直したため。	
自家用車乗降場・駐車場	駅前広場の改修にあわせ、障害者用停車施設を設置する。	短期	1	施設	計画													駅前広場の改修のスケジュールを見直したため。	
エレベーター	施設の大規模改修時にあわせて、エレベーター壁面の透過等への対応を検討する。	長期	1	基	計画														
エレベーター	施設の大規模改修時にあわせて、拡大や増設を検討する。	長期	1	基	計画														
エレベーター	エレベーターの改修に併せて電車の始発及び終電時間を考慮したエレベーター稼働時間の検討をする。	長期	1	基	計画													平成27年11月16日より南口エレベーターについて24時間運転を実施した。	●
トイレ(共通)	トイレマークの位置を見やすい位置に変更する。	短期	必要	箇所	計画													他施設の修繕に費用を要し実施できなかったため、設置時期の見直しを検討する。	
多機能トイレ	荷物用フックを設置する。	短期	1	箇所	計画													他施設の修繕に費用を要し実施できなかったため、設置時期の見直しを検討する。	
多機能トイレ	必要な機能を保ち、安心して使えるよう適切に維持管理する。	随時対応・定期実施	—	—	計画														継続
案内	茅ヶ崎市公共サインガイドラインに基づき、案内板及びサインの設置を見直す。(バス案内板はバス事業者と連携、案内板までの視覚障害者誘導用ブロック設置をあわせて検討)	中期	必要	箇所	計画													平成27年度にサインの図解サイン等の設計案を確定し、平成29年度から実施する南口再整備に併せて、バス案内板の見直しを行う。 変更点：南口改修が令和元年度以降となったため、短期から中期に変更した。	継続
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等		—																	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法		—																	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等		—																	

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—7

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路6) 市道0107号線 (桜道)																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	幸町6—16地先～幸町9—11地先																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	170m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
自転車走行環境	自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピクトグラムを設置する。	中期	300 	m	計画													幹線道路維持保全計画（自転車ネットワーク計画）に基づき整備予定。令和4年度実施なし。	
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<div style="text-align: right;">  事業予定区間・箇所を位置図に整理                 </div>																

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—8

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて		(主要経路9)市道0203号線(サザン通り)																
2. 事業主体	すべて		茅ヶ崎市																
3. 事業区間	道路管理者		サザンビーチ交差点～茅ヶ崎駅南口駅前広場																
4. 道路延長(m)	道路管理者		1,460m																
5. 所在地	建築物所有者・管理者等		—																
6. 事業計画及び事業実施状況	すべて		茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
歩行空間	交通管理者と連携して、路肩の拡幅や平坦化、一方通行化、駐停車抑制策、電柱等の移設等、経路の実状に合わせた可能な交通安全対策を実施する。	長期	交通管理者と連携して、路肩の拡幅や平坦化、一方通行化、駐停車抑制策、経路の実状に合わせた可能な交通安全対策を実施する。	必要	箇所	計画												実施時期の見直しを図る。	
歩行空間	電柱の民地への移設を電柱管理者に依頼する。	随時対応・定期実施	電柱の民地への移設を電柱管理者に依頼する。	必要	箇所	計画													
歩行空間	地域と連携し、看板の適正配置に努めるとともに、不法占用物の撤去指導を行う。	随時対応・定期実施	地域と連携し、看板の適正配置に努めるとともに、不法占用物の撤去指導を行う。	必要	箇所	計画												無許可での占用物については発見次第指導を実施している。	継続
歩行空間	横断箇所など歩行空間に支障となる雨水マスは、設置箇所の見直しや改良を検討する。	実施時期・方法検討中	横断箇所など歩行空間に支障となる雨水マスは、設置箇所の見直しや改良を検討する。	必要	箇所	計画												合流区域の場合、下水道河川管理課との協議が必要。	
歩行空間	舗装の適切な維持管理に努め、適宜修繕を行う。	随時対応・定期実施	職員が定期的実施しているパトロールの中で、路面状態の悪い箇所を適宜修繕する。	—	—	計画												定期的にパトロールを実施し穴埋め等を実施している。	継続
歩行空間	カラー舗装部分を補修する。	短期	カラー舗装部分を補修する。	3 4	箇所	計画												平成30年度中に完了できなかったため、実施時期の見直しを図る。令和3年度一部緑色の塗り直しを実施した。	
自転車走行環境	自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピクトグラムを設置する。	短期	自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピクトグラムを設置する。	524 5	m	計画												鉄砲道からツインウェイまでの区間については、幹線道路維持保全計画(自転車ネットワーク計画)の進捗に併せて実施時期変更。同路線の国道134号から鉄砲道までの区間の実施時期は長期を予定。	
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<div style="text-align: right;">  <b>事業予定区間・箇所を位置図に整理</b> </div>																

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—9

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路10) 市道0210号線 (エメロード、梅田通り)																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	茅ヶ崎駅北口駅前広場～ひじりき南公園地先																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	920m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期			
歩行空間	安全な歩行空間を確保する。(十間坂交差点から北側の一部区間)	長期	180	m	計画 変更 実績													令和3年度中に完了しなかったため、実施時期の見直しを図る。	
歩行空間	路肩のカラー舗装により歩行空間を整備する。(十間坂交差点から北側の一部区間)	中期	140	m	計画 変更 実績													令和2年度中に完了しなかったため、実施時期の見直しを図る。	
歩行空間	歩道が高い箇所の安全対策を検討する。	長期	240	m	計画 変更 実績													令和3年度中に完了しなかったため、実施時期の見直しを図る。	
歩行空間	放置自転車等の撤去を実施するとともに、不法占用物の撤去指導を行う。	随時対応・定期実施	必要	箇所	計画 変更 実績													無許可での占用物については発見次第指導を実施している。	継続
歩行空間	一部区間において、電線類地中化により安全で快適な歩行空間を確保する。	長期	421	m	計画 変更 実績													令和3年度中に完了見込がないため、実施時期の見直しを図る。	
歩行空間	電線類地中化の計画と整合を図りながら、舗装等の整備方法を検討する。	長期	421	m	計画 変更 実績													令和3年度中に完了見込がないため、実施時期の見直しを図る。	
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等		—																	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法		—																	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等		—																	

 事業予定区間・箇所を位置図に整理

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—10

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄															
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路12) 市道0217号線 (一里塚北通り)															
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市															
3. 事業区間		道路管理者	一里塚交差点～本村4丁目8—12地先															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	480m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期							事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了		
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期		
施設出入口	生活関連施設の出入口に接する道路に視覚障害者誘導用ブロックを設置し、施設のブロックと連続するような整備を検討する。	実施時期・方法検討中	1	路線	計画													
踏切	小出踏切内の歩道幅員を拡幅する。	長期	—	—	計画												令和3年度中に完了見込がないため、実施時期の見直しを図る。	
踏切	小出踏切内の路面表示 (矢羽根) を整備する。	中期	1	箇所	計画												幹線道路維持保全計画 (踏切対策計画) に基づき整備完了。	●
自転車走行環境	自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピクトグラムを設置する。	中期	480	m	計画												幹線道路維持保全計画 (自転車ネットワーク計画) に基づき整備予定。	●
					計画													
					計画													
					計画													
					計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—															
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

 事業予定区間・箇所を位置図に整理

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—11

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路13) 市道1215号線 (桜道)																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	幸町6—16地先～茅ヶ崎駅南口駅前広場																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	360m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
歩行空間	交通管理者と連携し、啓発員の巡回による違法駐車の指導・啓発を行う。	随時対応・定期実施	交通管理者と連携し、啓発員の巡回による違法駐車指導の指導・啓発を行う。	—	—	計画												茅ヶ崎市違法駐車等防止条例及び施行規則に基づき実施。	
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

**【推進管理シート】道路特定事業**

**特定事業等の実施時期凡例**

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号： 道路—12

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路14) 市道1660号線																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	元町17—4地先～元町9—12地先																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	240m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
歩行空間	舗装修繕時に排水部分の段差への対応を検討する。	長期	舗装修繕時に排水部分の段差への対応を検討する。	必要	箇所	計画												合流区域であるため、下水道河川管理課との連携が必要。	
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—13

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄															
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路18) 市道2059号線 (サザンビーチ地下道)															
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市															
3. 事業区間		道路管理者	サザンビーチ地下道															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	60m															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了	
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中
歩行空間	手すりの設置と点字の表示方法について検討する。	長期	手すりの設置と点字の表示方法について検討する。	1	施設	計画											令和3年度中に検討完了見込がないため、実施時期の見直しを図る。	
案内	自転車走行禁止に関する案内を検討し設置する。(路面表示等)	中期	路面に自転車走行禁止に関する案内を検討し設置する。	2	箇所	計画											地下道壁面に既設で自転車走行禁止に関する表示あり。平成30年度中に事業実施できなかったため、実施時期や内容の見直しを行う。	
						計画												
						変更												
						実績												
						計画												
						変更												
						実績												
						計画												
						変更												
						実績												
						計画												
						変更												
						実績												
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—															
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—14

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	(主要経路19) 市道2199号線 (高砂通り)																	
2. 事業主体	すべて	茅ヶ崎市																	
3. 事業区間	道路管理者	中海岸一丁目1—66地先～野球場前交差点																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	1,040m																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	—																	
6. 事業計画及び事業実施状況	すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況							
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容			規模		実施時期							事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了		
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期			
歩行空間	地域と連携し、看板の適正配置に努めるとともに、不法占用物の撤去指導を行う。	随時対応・定期実施	必要	箇所	計画													無許可での占用物については発見次第指導を実施している。	継続
歩行空間	電柱の民地への移設を電柱管理者に依頼する。	随時対応・定期実施	必要	箇所	計画														
歩行空間	交通管理者と連携して、路肩の拡幅や平坦化、一方通行化、駐停車抑制策、電柱等の移設等、経路の実状に合わせた可能な交通安全対策を実施する。	長期	必要	箇所	計画													地域住民との同意、電気通信事業者の協力を必要とするため、実施時期を検討。	
歩行空間	横断箇所など歩行空間に支障となる雨水マスは、設置箇所の見直しや改良を検討する。	実施時期・方法検討中	必要	箇所	計画														
歩行空間	舗装の適切な維持管理に努め、適宜修繕を行う。	随時対応・定期実施	—	—	計画													定期的にパトロールを実施し穴埋め等を実施している。	継続
歩行空間	カラー舗装部分を補修する。	短期	1	路線	計画													平成29年度に事業実施完了。	●
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—15

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路21) 市道2242号線																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	元町4—1～新栄町13—45																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	116m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
歩行空間	カラー舗装部分を補修する。	短期	カラー舗装部分を補修する。	1	路線	計画												ヤマダ電機側復旧済。コーカドー側未着手。	
歩行空間	電線類地中化により安全で快適な歩行空間を確保する。	長期	電線類地中化により安全で快適な歩行空間を確保する。	116	m	計画												令和3年度中に完了見込がないため、実施時期の見直しを図る。	
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			 事業予定区間・箇所を位置図に整理																

**【推進管理シート】道路特定事業**

番号：道路—16

**特定事業等の実施時期凡例**

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄														
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路22) 市道2244号線														
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市														
3. 事業区間		道路管理者	新栄町交差点～新栄町8—8地先														
4. 道路延長 (m)		道路管理者	220m														
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—														
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況				
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5		
施設出入口	生活関連施設の出入口に接する道路に視覚障害者誘導用ブロックを設置し、施設のブロックと連続するような整備を検討する。	実施時期・方法検討中	1	路線	計画												
					変更												
					実績												
					計画												
					変更												
					実績												
					計画												
					変更												
					実績												
					計画												
					変更												
					実績												
					計画												
					変更												
					実績												
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—														
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—														

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—17

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路24) 市道4002号線																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	茅ヶ崎二丁目2-3～茅ヶ崎三丁目1-23																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	390m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
歩行空間	植栽帯撤去により歩道を拡幅する。	中期	植栽帯撤去により歩道を拡幅する。	必要	箇所	計画												中央公園再整備事業は完了したが、未施工であるため今後調整する。	
歩行空間	歩道拡幅にあわせて、休憩スペース（ベンチ）を設置する。	中期	歩道拡幅にあわせて、休憩スペース（ベンチ）を設置する。	必要	箇所	計画												中央公園再整備事業は完了したが、未施工であるため今後調整する。	
						計画													
						変更													
						実績													
						計画													
						変更													
						実績													
						計画													
						変更													
						実績													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—18

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路25) 市道4006号線																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	茅ヶ崎二丁目7—58～北茅ヶ崎駅前広場																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	280m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
踏切	北茅ヶ崎駅自由通路・橋上駅舎化にあわせ、踏切手前のスロープ勾配改善や十分な幅員の確保を検討する。	長期	1	箇所	計画													自由通路・橋上駅舎化のスケジュールと連携を図るため。	
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—																

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—19

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄														
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路26) 市道5004号線														
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市														
3. 事業区間		道路管理者	飯島交差点～保健福祉事務所前交差点														
4. 道路延長 (m)		道路管理者	450m														
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—														
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況				
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5		
自転車走行環境	自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピクトグラムを設置する。	長期	1	路線	計画												
					変更												
					実績												
					計画												
					変更												
					実績												
					計画												
					変更												
					実績												
					計画												
					変更												
					実績												
					計画												
					変更												
					実績												
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—														
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																	

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—20

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄														
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路28) 市道5563号線														
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市														
3. 事業区間		道路管理者	茅ヶ崎市役所本庁舎地先～県道45号 (丸子中山茅ヶ崎線)														
4. 道路延長 (m)		道路管理者	200m														
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—														
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況				
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5		
歩行空間	歩道の波打ちやがたつきを改善する。	中期	歩道の波打ちやがたつきを改善する。	200	m	計画											
						変更											
						実績											
						計画											
						変更											
						実績											
						計画											
						変更											
						実績											
						計画											
						変更											
						実績											
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—														
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			【現況写真】 														

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—21

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄														
1. 施設名、路線名		すべて	(補完経路2) 市道0121号線														
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市														
3. 事業区間		道路管理者	中海岸二丁目交差点～東海岸会館前交差点														
4. 道路延長 (m)		道路管理者	610m														
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—														
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況				
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5		
歩行空間	一部区間において電線類地中化により安全で快適な歩行空間を確保する。	長期	一部区間において電線類地中化により安全で快適な歩行空間を確保する。	610	m	計画											
						変更											
						実績											
自転車走行環境	自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピクトグラムを設置する。	中期	自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピクトグラムを設置する。	602	m	計画											
						変更											
						実績											
						計画											
						変更											
						実績											
						計画											
						変更											
						実績											
						計画											
						変更											
						実績											
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—														
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<div style="text-align: right;">  事業予定区間・箇所を位置図に整理                 </div>														

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—22

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(補完経路4) 市道2241号線																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	元町3—1地先～新栄町6—3地先																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	254m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
歩行空間	一部区間において電線類地中化により安全で快適な歩行空間を確保する。	長期	254 	m	計画													令和3年度中に完了見込がないため、実施時期の見直しを図る。	
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<div style="text-align: right;">  事業予定区間・箇所を位置図に整理                 </div>																

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—23

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(補完経路5) 市道2247号線																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	茅ヶ崎警察署前交差点～新栄町6—3																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	78m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
歩行空間	電線類地中化により安全で快適な歩行空間を確保する。	長期	78 	m	計画													令和3年度中に完了見込がないため、実施時期の見直しを図る。	
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<div style="text-align: right;">  事業予定区間・箇所を位置図に整理                 </div>																

【推進管理シート】道路特定事業

番号：道路—24

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	ふれあいはし																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
施設出入口	生活関連施設の出入口に接する道路に視覚障害者誘導用ブロックを設置し、施設のブロックと連続するような整備を検討する。	実施時期・方法検討中	生活関連施設の出入口に接する道路に視覚障害者誘導用ブロックを設置し、施設のブロックと連続するような整備を検討する。	1	施設	計画												市役所前広場整備にて設置。	●
案内	スロープ入口に市民文化会館への案内表示を設置する。	中期	スロープ入口に市民文化会館への案内表示を設置する。	—	—	計画												市役所前広場整備にて設置。	●
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】道路特定事業


番号：道路—25

特定事業等の実施時期凡例


[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	(主要経路1) 国道1号																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	茅ヶ崎駅前交差点地下道																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
茅ヶ崎駅前交差点地下道	市と協議のうえ、地下道通路部の歩行者と自転車の通行位置の明示について検討する。	実施時期・方法検討中	1	施設	計画													国、市で協議の上、施設の表面管理者である市で事業を実施することとした。	
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—																

市道等：事業予定区間・箇所位置図

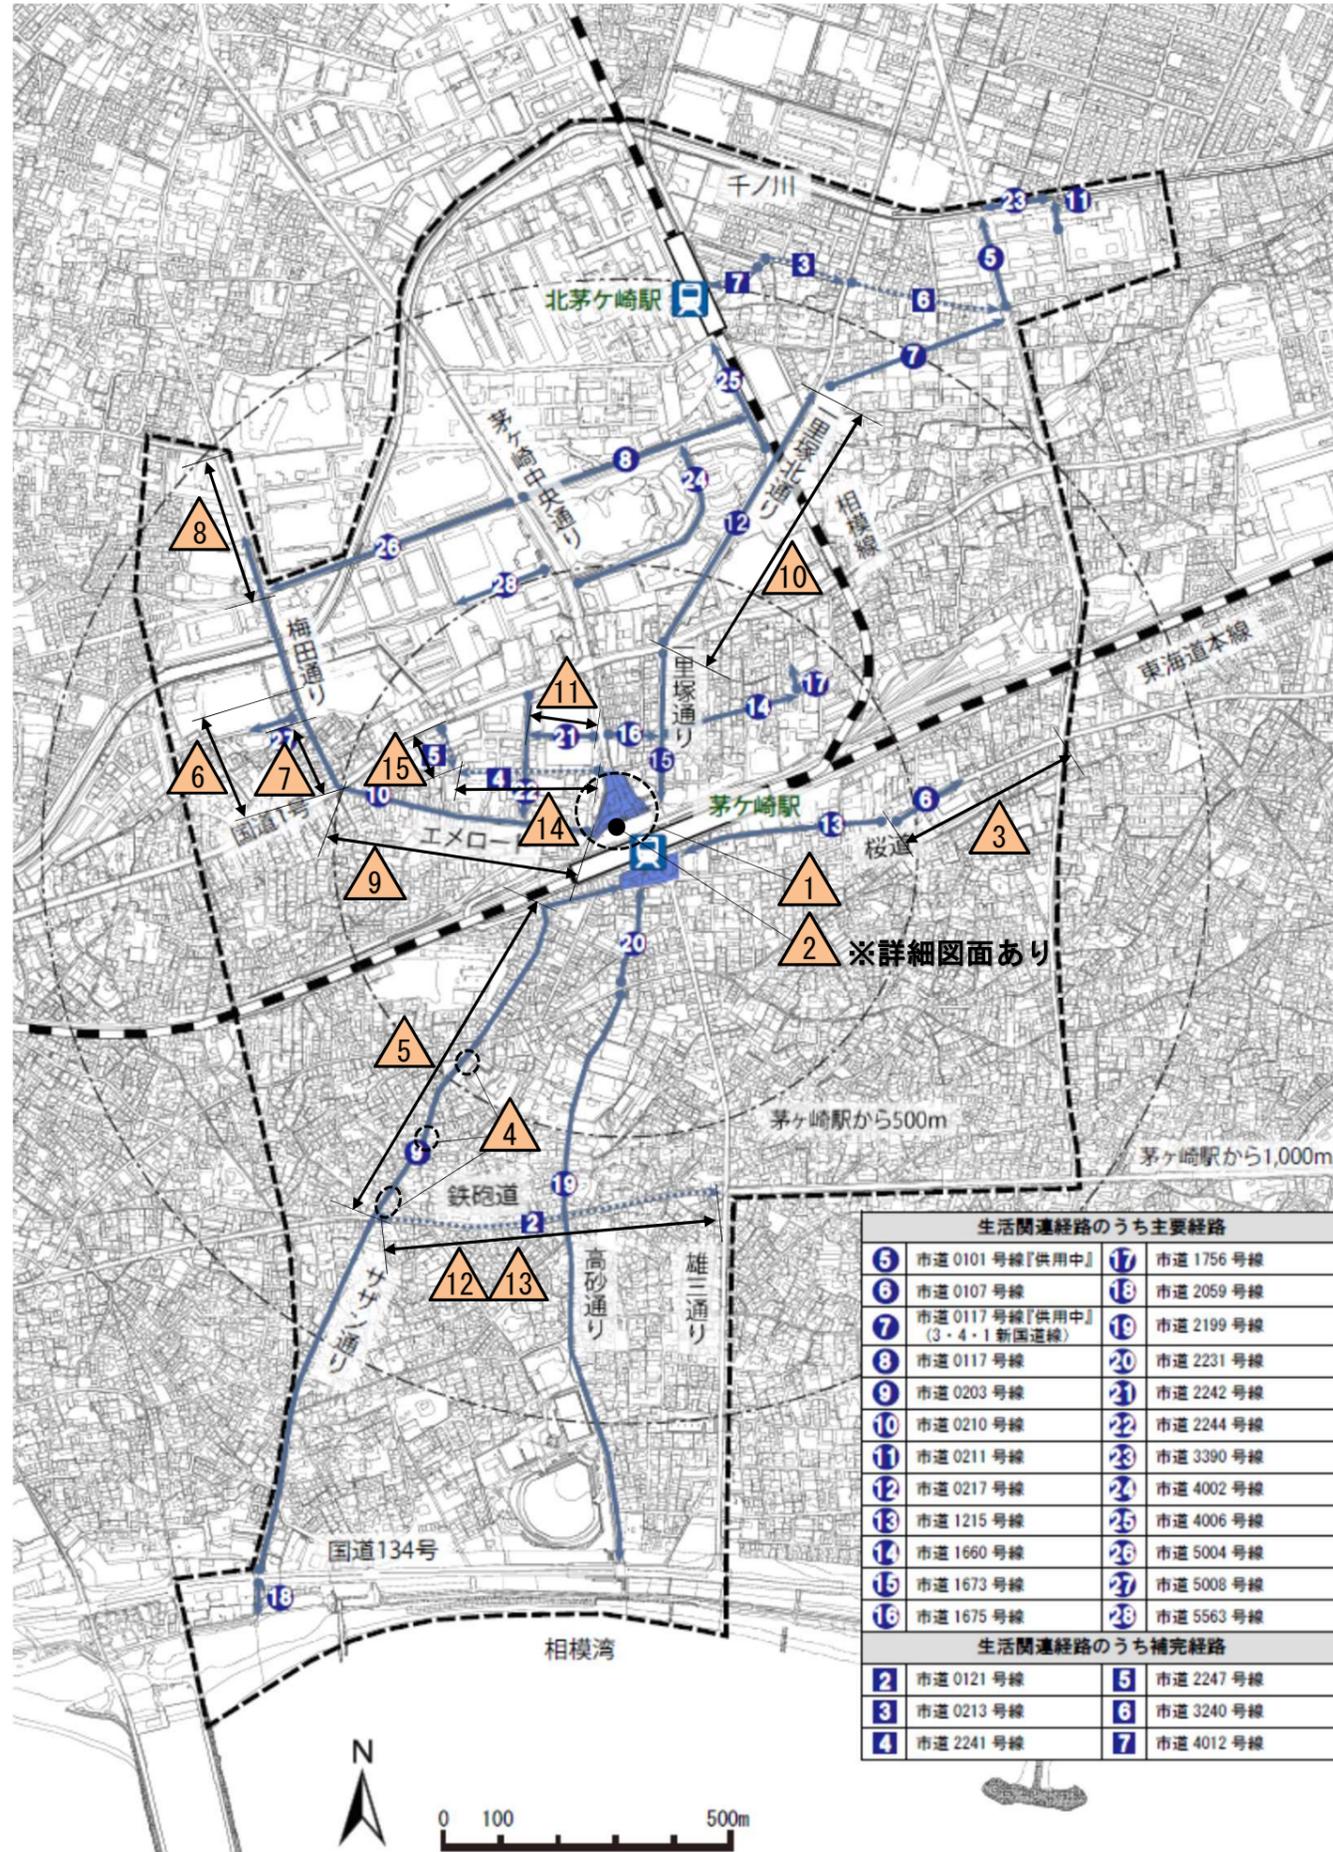

詳細図面：茅ヶ崎駅北口駅前広場

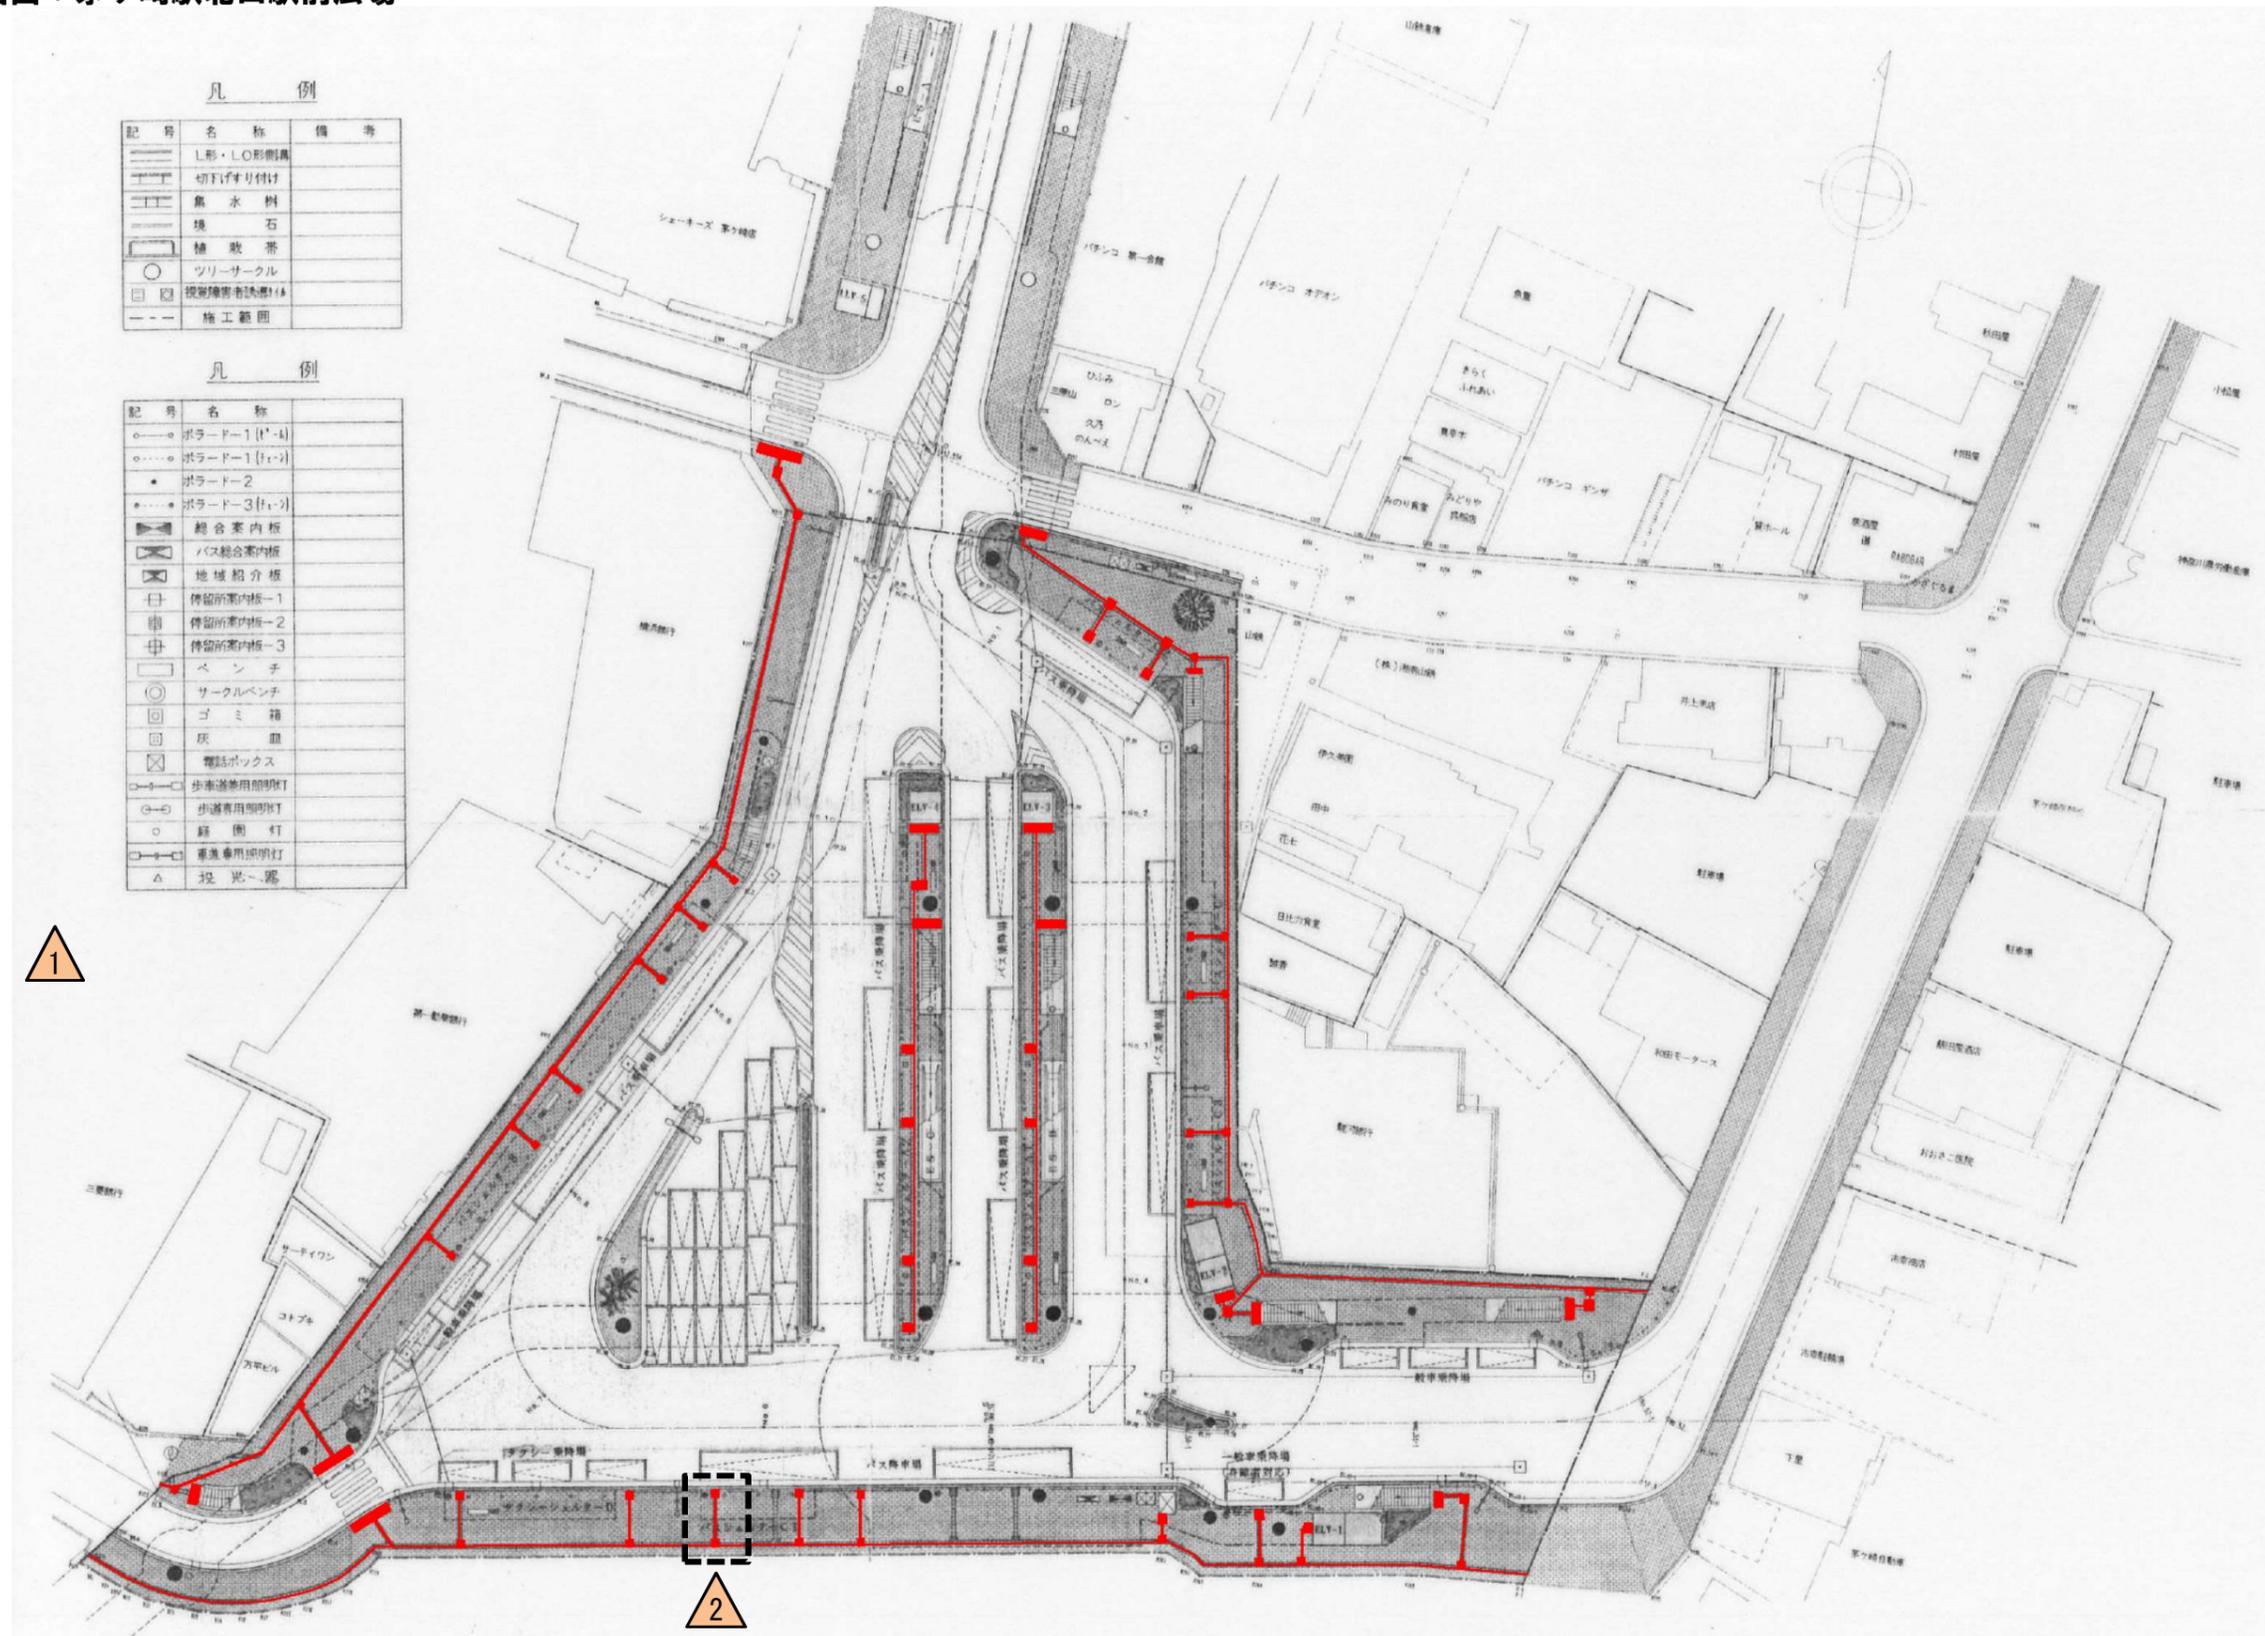

凡 例

記号	名称	備考
[L-shaped line]	L形・L0形側溝	
[dashed line]	切下げ手すり付	
[hatched area]	集水料	
[hatched area]	塊石	
[hatched area]	植栽帯	
[circle]	ツリーサークル	
[square]	視覚障害者誘導線	
[dashed line]	施工範囲	

凡 例

記号	名称
[circle]	ポラード-1 (1'・4)
[circle]	ポラード-1 (1'・2)
[circle]	ポラード-2
[circle]	ポラード-3 (1'・2)
[hatched area]	総合案内板
[hatched area]	バス総合案内板
[hatched area]	地域紹介板
[hatched area]	停留所案内板-1
[hatched area]	停留所案内板-2
[hatched area]	停留所案内板-3
[circle]	ベンチ
[circle]	サークルベンチ
[square]	ゴミ箱
[square]	灰皿
[square]	電話ボックス
[square]	歩車道兼用照明灯
[square]	歩道専用照明灯
[square]	緑園灯
[square]	車道専用照明灯
[triangle]	投光器

1

2



茅交発第 2643 号  
令和4年 8月19日

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会  
会長 大原 一興 殿

神奈川県茅ヶ崎警察署  
署長 坂本 仁 義

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の進捗について

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の進捗について、次のとおり回答いたします。  
記

- 1 信号機のLED化について  
神奈川県公安委員会の更新計画に合わせて実施中  
茅ヶ崎市バリアフリーエリア信号交差点表

番号	管理番号	交差点名	設置場所	LED 信号
1	31-003	茅ヶ崎駅南口入口	茅ヶ崎市東海岸南1-22	実施済み
2	31-005	サザンビーチ	茅ヶ崎市中海岸4-15	実施済み
3	31-014	茅ヶ崎駅入口	茅ヶ崎市新栄町12-31	実施済み
4	31-015	一里塚	茅ヶ崎市元町5-18	実施済み
5	31-018	十間坂	茅ヶ崎市十間坂3-1-3	実施済み
6	31-037	野球場前	茅ヶ崎市中海岸3-3	実施済み
7	31-065	飯島歩道橋	茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16	
8	31-070	茅ヶ崎警察署前	茅ヶ崎市十間坂1-3-25	実施済み
9	31-119	保健福祉事務所前	茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8	実施済み
10	31-134	市営プール前	茅ヶ崎市中海岸3-9-2	実施済み
11	31-147	新栄町	茅ヶ崎市新栄町13	実施済み
12	31-155	中央公園北口	茅ヶ崎市茅ヶ崎2-3	実施済み
13	31-197	市立図書館入口	茅ヶ崎市中海岸1-5-7	実施済み
14	31-207	本村4丁目	茅ヶ崎市本村4-17-16	
15	31-208	本村5丁目	茅ヶ崎市本村5-6-23	
16	31-209	茅ヶ崎市立病院前	茅ヶ崎市本村5-8	
17	31-210	中海岸2丁目	茅ヶ崎市中海岸2-4-26	
18	31-221	中央公園前	茅ヶ崎市茅ヶ崎2-3	
19	31-239	新栄町中央	茅ヶ崎市新栄町11-13	実施済み
20	31-240	北茅ヶ崎駅入口	茅ヶ崎市茅ヶ崎3-1-14	実施済み
21	31-241	元町	茅ヶ崎市元町4-1	実施済み

- 2 自転車専用通行帯について  
道路管理者と路線を検討しているもの。
- 3 茅ヶ崎駅南口駅前広場について  
茅ヶ崎駅南口交差点改良にあつては、令和4年7月に本部協議終了。
- 4 飯島歩道橋交差点について  
(1) 飯島歩道橋にあつては廃止済み。  
(2) 交通安全キャンペーン等により、随時マナーアップ指導を実施中。  
(3) 音響式信号機を設置。
- 5 イオン茅ヶ崎店周辺について  
交通安全キャンペーン等により、随時マナーアップ指導を実施中。

担当	交通総務係	電話	82-0110
----	-------	----	---------

【推進管理シート】建築物特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号： 建築物—1

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	茅ヶ崎市役所																	
2. 事業主体	すべて	茅ヶ崎市																	
3. 事業区間	道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎1—1—1																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-			検討中	随時・定期
全体	移動等円滑化基準に沿った建物に改修する。	短期	移動等円滑化基準に沿った建物に改修する。	—	—	計画	■											新庁舎供用開始に伴い、法令に適合した階段、階段両側の手すりを設置した。また、新庁舎周りの通路には滑りにくい素材を使用した。	●
出入口	視覚障害者等が出入口の場所を認識できるように、新庁舎の出入口（北・東・南）に音声誘導設備を設置する。	短期	視覚障害者等が出入口の場所を認識できるように、新庁舎の出入口（北・東・南）に音声誘導設備を設置する。	3	箇所	計画	■											新庁舎供用開始に伴い、新庁舎の出入口（北・東・南）に音声誘導設備を設置した。	●
駐車場	新庁舎北側出入口付近に車いす使用者用駐車施設を3台分設置し、雨天時を考慮して建物出入口まで続く庇を設置する。また、分庁舎東側にも車いす使用者用駐車施設を2台分設置する。	短期	新庁舎北側出入口付近に車いす使用者用駐車施設を3台分設置し、雨天時を考慮して建物出入口まで続く庇を設置する。また、分庁舎東側にも車いす使用者用駐車施設を2台分設置する。	5	台	計画	■											新庁舎供用開始に伴い、新庁舎北側ロータリーに3台分設置した。また分庁舎東側に庇付きの車椅子使用者用駐車施設を2台設置した。	●
駐輪場	新庁舎西側、分庁舎東側、県道隣接地に駐輪場を設置する。	短期	新庁舎西側、分庁舎東側、県道隣接地に駐輪場を設置する。	1	箇所	計画	■											分庁舎東側に来庁者用駐輪場、県道沿いに公用自転車用駐輪場を整備した。	●
案内	文字や大きさ、色等に配慮した見やすくわかりやすいサイン表示を設置する。（全体案内図、各課の案内表示や行き方等）	短期	文字や大きさ、色等に配慮した見やすくわかりやすいサイン表示を設置する。（全体案内図、各課の案内表示や行き方等）	—	—	計画	■											新庁舎供用開始に伴い、新庁舎1階ロビーやエレベーターホール等に案内表示を設置した。	●
案内	新庁舎東側の多機能トイレに音声誘導設備を設置する。	短期	新庁舎東側の多機能トイレに音声誘導設備を設置する。	12	箇所	計画	■											新庁舎供用開始に伴い、新庁舎1階～6階東側の多機能トイレに音声誘導案内を設置した。また、新庁舎1階の総合案内、エレベーター前、2階のエレベーターホール、男子・女子トイレ、6階のエレベーターホール、男子・女子トイレの音声誘導案内を設置した。	●
心のバリアフリー	職員研修を継続して実施する。	随時対応・定期実施	職員研修を継続して実施する。	—	—	計画	■											職員研修を継続して実施している。	継続
その他	子育てに関連する課の付近に授乳室やベビーシート等を設置する。	短期	子育てに関連する課の付近に授乳室やベビーシート等を設置する。	1	箇所	計画	■											新庁舎供用開始に伴い、新庁舎1階西側に授乳室を設置した。	●
その他	十分な照度を確保する。（利用者がいる場合は夜間も点灯する）	随時対応・定期実施	十分な照度を確保する。（利用者がいる場合は夜間も点灯する）	—	—	計画	■											夜間の会議室利用や夜間戸籍届出受付等を考慮し、市役所敷地内の照明を確保している。	継続
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—																

【推進管理シート】建築物特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号： 建築物—2

項目		該当事業者	記入欄															
1. 施設名、路線名	すべて	茅ヶ崎駅前市民窓口センター（市民ギャラリー）																
2. 事業主体	すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間	道路管理者	—																
4. 道路延長（m）	道路管理者	—																
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市元町1番1号 ネスパ茅ヶ崎3階																
6. 事業計画及び事業実施状況	すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画																
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期								事業実施状況			
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期	事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	—	—													H27:職員に対し、基本構想の内容説明を行い、周知を図った。 H28:職員に対し、基本構想の内容説明を説明するとともに、障害者への理解を深めるため手話研修を行い、周知を図った。 H29:職員に対し、基本構想の内容説明を行い、周知を図った。 H30:職員に対し、基本構想の内容説明を行い、周知を図った。 R1:職員に対し、基本構想の内容説明を行い、周知を図った。 R2:職員に対し、基本構想の内容説明を行い、周知を図った。 R3:職員に対し、基本構想の内容説明を行い、周知を図った。 R4:職員に対し、基本構想の内容説明を行い、周知を図る。	継続
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—															
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—															

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—3

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎市民文化会館																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎1—1 1—1																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画											事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期	事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了	
全体	大規模改修工事の変更設計にあわせ、移動等円滑化基準に沿った建物に改修する。(自動ドア、階段、舗装、多機能トイレ等)	中期	必要	箇所	計画														
ホール	大規模改修工事の変更設計にあわせ、小ホールにおける保育室の設置を検討する。	中期	1	箇所	計画												保育室として利用可能な多目的室を設置した。	●	
敷地内通路	スロープの設置場所を示す案内表示を設置する。	短期	必要	箇所	計画													●	
敷地内通路	中央公園側の階段の手すりの延長を検討する。(水平部まで)	短期	1	箇所	計画													●	
敷地内通路	がたつきのない舗装への改善を検討する。	短期	必要	箇所	計画													●	
敷地内通路・建物内通路	視覚障害者誘導用ブロックの配置等の改善を検討する。(敷地内通路の階段手すりとの連続性、駐車場、危険箇所への設置等)	短期	必要	箇所	計画													●	
階段	トイレ手前の階段への両側手すりの設置を検討する。	短期	2	箇所	計画													●	
案内	見やすく、わかりやすい案内表示の設置を検討する。(全体案内図、各部屋の案内表示や行き方、弱視・色弱者に配慮した色使い、一般的なピクトグラムの使用等)	短期	必要	箇所	計画													●	
駐車場	一般用の駐車場の増設を検討する。	短期	必要	箇所	計画												改修工事により施設内の駐車場は減となったが、行政拠点地区駐車場有料化に伴い、どの駐車場も利用することが可能とすることで実質的に増となった。	●	
駐車場	車いす利用者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、路面の塗装や国際シンボルマークをわかりやすく表示するなどの対策を検討する。	短期	必要	箇所	計画													●	
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	14	名	計画												現状の運用の中で主催者打合せ時や必要に応じた付添いの対応をしている。今後もOJTなどの形を中心として、引き続き職員の教育を行う。	継続	
その他	大規模改修工事にあわせ、十分な照度を確保する。	短期	必要	箇所	計画													●	
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			<ul style="list-style-type: none"> <li>茅ヶ崎市民文化会館耐震補強及び改修工事を平成29年度から30年度にかけて実施した。</li> <li>修正設計を行うにあたり参考とするため、平成28年1月に計2回の障害者関係団体との意見交換及びバリアフリー化を進めるために関係する部署のヒアリングを実施した。</li> <li>平成28年7月にバリアフリー基本構想推進協議会市民部会委員との意見交換会を実施した。</li> </ul>																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—4

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄															
1. 施設名、路線名	すべて	茅ヶ崎市立図書館																
2. 事業主体	すべて	茅ヶ崎市立図書館																
3. 事業区間	道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市東海岸北1—4—55																
6. 事業計画及び事業実施状況	すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可		具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
建物内通路	モノや設備などで視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないように配慮する。	随時対応・定期実施	—	—	計画												障害福祉課と協議の結果、ブロック張替えの必要は無しの結論となった。利用者が椅子に座るとブロックの一部に椅子がかかってしまうので、利用者の動線と貸出・返却カウンターの配置を検討する。	継続
エレベーター	車いす使用者の利用に配慮して、エレベーター内で回転しなくても戸の開閉状況が確認できる鏡に交換する。	短期	1	個	計画												平成27年3月に鏡を付け替えた。令和3年度にバリアフリーの機能を保持したまま改修工事を実施。	●
案内	エレベーターの設置位置について、見やすく、わかりやすい案内表示を設置する。	短期	1	箇所	計画												設置位置について見やすく、わかりやすい案内表示位置を検討し、設置した。	●
案内	点字を読み取りやすいものに改善する。	短期	14	箇所	計画												ボランティア団体に現場確認を依頼し、現状と改めて新設が必要な場所の選定を行い、点字シールの作成及び張替を行った。	●
心のバリアフリー	障害者単独での利用が難しい場所（高い本棚等）での、人によるサポートなどの対応を徹底する。	随時対応・定期実施	—	—	計画												障害者単独での利用が困難な場所（高い本棚等）での職員によるサポートなどの対応を徹底する。	継続
その他	車いす使用者が閲覧できるよう、スペースについて配慮した運用を行う。	随時対応・定期実施	—	—	計画												建替時に大規模改修し実施となるため、運用方法での解決策を検討する。	継続
その他	十分な照度を確保する。	短期	—	—	計画												8月にハロゲンランプを増設設置し、照度を向上させた。平成30年2月に館内の照明器具をLED化して、更に照度を向上させた。	●
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等		—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法		—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—5

特定事業等の実施時期凡例

【短期】H27～29年度に実施する事業 【中期】H30～R4年度に実施する事業 【長期】R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 【実施時期・方法検討中】R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	茅ヶ崎市美術館																	
2. 事業主体	すべて	茅ヶ崎市																	
3. 事業区間	道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市東海岸北1-4-45																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期						事業に関する補足や検討状況、変更点など			完了			
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期			
出入口	視覚障害者誘導用ブロックが足ふきマットや物などで覆われないように配慮する。	短期	2	箇所	計画	■												視覚障害者誘導用ブロックが足拭きマットで覆われないよう、ブロックの両側へ分割する等して対応。(現況写真参照)	●
階段	改修工事等の機会にあわせ、階段を改修する。(両側手すりの設置、段を突き出さないものへの改善、点字の改善等)	実施時期・方法検討中	2	箇所	計画													改修工事等の機会に実施を検討(時期未定) 【該当箇所】 ・B1Fから1Fへの階段→片側に手すりを設置(平成28年度)	
多機能トイレ	改修工事等の機会にあわせ、使用中か否かを表示する装置を修理する。	実施時期・方法検討中	1	箇所	計画													ライトの点灯時間を調整し、事業完了としました。	●
多機能トイレ	多機能トイレの洗浄ボタンなどの使い方などについてわかりやすい説明書きを設置する。	短期	1	箇所	計画	■												各ボタンの用途を付記し、事業完了としました。	●
駐車場	安全で十分な広さの乗降スペースを確保した車いす使用者用駐車施設に改善する。(幅350cm以上)	短期	1	箇所	計画													駐車場の有料化検討の過程で、車椅子使用者用駐車スペースについても対応を検討する。	
案内	案内の解説は、知的障害者等にもわかりやすい表現や内容に工夫する。	長期	必要	—	計画													・障害の特性が多岐にわたるため、全ての利用者に網羅した対応は困難だが、展覧会の内容等に応じて展示や案内等の方法を工夫する。 ・平成30年4月～受付に「筆談可能な掲示」と「コミュニケーションボード」を設置した。 ・令和元年7月～館内掲示のパネル等に文字の認識がしやすいUDフォントを使用。 ・令和元年7～9月に開催した企画展では、点字チラシを作成した。また、目の不自由な方に向け、スマートフォン等での読み上げ機能に対応できるよう、テキストデータ入りのQRコードを会場パネルに配置した。 ・令和元年4月～緊急時の誘導灯を館内各所に設置した。	継続
心のバリアフリー	障害者等への特別な配慮やサービスについて、その内容を高砂緑地、駐車場等に掲示するとともに、ホームページに記載する。	短期	必要	—	計画	■												・ホームページに記載している。(参照 <a href="https://www.chigasaki-museum.jp/guide/facility.html">https://www.chigasaki-museum.jp/guide/facility.html</a> ) ・平成30年7月に図書館側の通用出入口に案内看板を設置した。 ・令和元年7月に高砂緑地入口の美術館看板に身体の不自由なお客様への案内を掲示した。	継続
その他	車いす使用者等の目線からも見やすい展示方法に配慮する。	随時対応・定期実施	必要	—	計画													・展覧会の内容や展示する作品の大きさ等にもよるが、今後も車いす使用者等の目線からも見やすいよう配慮した展示を心掛ける。 ・平成30年度に開催した特別展示「いのこえ」では、車椅子の方が作品に触れやすいよう展示台を低く設定した。令和元年度以降の展覧会においても一部同様に対応している。	継続
その他	障害があっても施設の魅力に触れられるような工夫をする。	実施時期・方法検討中	必要	—	計画													・障害の特性が多岐に渡るため、全ての利用者に網羅した対応は困難だが、展覧会の内容等に応じて展示や案内等の方法を工夫する。 ・平成30年度～令和2年度にかけて、触れると音や香りが出る作品の展示を行った。 ・一部トークイベントに手話通訳を付けている。 ・作品紹介カードを配付した展覧会では、テキストデータ入りのQRコードを印刷し切り欠きを施したカードを併せて用意した。	継続
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>マット配置変更実施状況 (1F玄関入口)</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>障害者等へ案内掲示 (図書館側通用出入口)</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>障害者等への案内解説 (筆談可能な掲示、コミュニケーションボードの導)</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>多機能トイレの説明書き (洗浄ボタン)</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>多機能トイレの洗浄ボタン (洗浄ボタン(足元))</p>  </div> </div>																

【推進管理シート】建築物特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27~29年度に実施する事業 [中期]H30~R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号：建築物—6

項目		該当事業者	記入欄															
1. 施設名、路線名	すべて		茅ヶ崎市総合体育館															
2. 事業主体	すべて		茅ヶ崎市															
3. 事業区間	道路管理者		—															
4. 道路延長 (m)	道路管理者		—															
5. 所在地	建築物所有者・管理者等		茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目9-6 3															
6. 事業計画及び事業実施状況			茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期							事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了		
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期		
敷地内通路	視覚障害者誘導用ブロックに黄色の塗料を塗るなど、路面との色の違いがわかりやすくする。	実施時期・方法検討中	15.7	m	計画												塗る方向で検討中	●
建物内通路	衝突する危険性のある柱となりうるかどうか、利用者の動向をみながら、必要に応じて案内表示の取付などを実施する。	実施時期・方法検討中	4	本	計画												新型コロナ関連の注意喚起、案内表示が増えてしまい、案内表示等の見直しに影響有り。	
エレベーター	更新の際は、障害者等が利用しやすい構造に配慮した設備に改修する。(十分な広さ、わかりやすいボタン、足下まで見える鏡の設置、音声案内、手すりなど)	長期	1	基	計画												エレベーター更新のメーカー業者による提案、見積書を徴取済み。今後予算措置を目指す。	
多機能トイレ	車いす使用者が開閉しやすいドアに改善する。(たてつけ改善、ドアの溝を浅くする等)	実施時期・方法検討中	2	箇所	計画												上下ローラー部を調整し、たてつけを改善。	●
一般トイレ	洋式トイレを増設する。	短期	3	基	計画												平成27年度：3基修繕 平成28年度：3基修繕 今後、中・長期的に洋式トイレへの修繕を進める。	●
駐車場	車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、路面を塗装し国際シンボルマークをわかりやすく表示する。	短期	4	箇所	計画													●
駐車場	車いす使用者が多く集まるイベント開催時は、臨時に車いす使用者用駐車施設を増設する。	随時対応・定期実施	必要	箇所	計画												管理主管課である安全対策課との協議が必要である。	継続
観覧席	他の老朽化している設備の修繕にあわせて、より安全性の高い手すりに更新する。	長期	45.24	m	計画												車いす用観覧スペースのフェンス柵を重点的に増やすことで、安全対策を実施	●
案内	案内表示の色、位置、大きさ等を見やすく、わかりやすいものに改善する。	随時対応・定期実施	必要	箇所	計画												新しく掲示物を張る場合は、なるべく大きくするようにしている。	継続
案内	視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮した案内を充実する。	長期	必要	箇所	計画												新型コロナ関連の注意喚起、案内表示が増えてしまい、案内表示等の見直しに影響有り。	
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	—	—	計画												意識啓発に努めている(障害者参加のイベントを通じての関係スタッフの気付き等)。	継続
心のバリアフリー	利用者などの駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないように配慮する。	随時対応・定期実施	—	—	計画												菊花展や前庭利用などのイベントでは点字ブロック周辺に物の設置をしないよう徹底している。	継続
その他	十分な照度を確保する。(駐車場等)	短期	3,450	m <sup>2</sup>	計画													●
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—															
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—															





【推進管理シート】建築物特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27~29年度に実施する事業 [中期]H30~R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号： 建築物—9

項目		該当事業者	記入欄															
1. 施設名、路線名	すべて	高砂コミュニティセンター																
2. 事業主体	すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間	道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市中海岸1丁目2-4 2																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期		
出入口	高齢者、障害者等がつまずきにくいように玄関マットを固定する。	短期	3	箇所	計画	■												
敷地内通路	車いすの動線となる主要な通路の舗装をがたつきのないものに変更する。	長期	必要	箇所	計画													
階段	手すりを水平部まで延長する。	短期	4	箇所	計画	■												
階段	段鼻の色を強調する。	短期	5	箇所	計画	■												
多機能トイレ	車いす使用者が利用しやすい多機能トイレに改修する。(開閉しやすいドア、下部に十分なスペースがある洗面器等)	長期	1	箇所	計画													
多機能トイレ	ドアに使用中か否かを表示する札等を設置する。	短期	1	箇所	計画	■												
トイレ(共通)	室内やトイレなどに、非常事態を聴覚障害者に知らせることができるフラッシュライト等を設置する。	長期	必要	箇所	計画													
トイレ(共通)	緊急ボタンに点字を設置する。	短期	2	箇所	計画	■												
案内	見やすく、わかりやすい案内表示に改善する。(弱視・色弱者に配慮した色使い、一般的なピクトグラム(標準案内用図記号)の使用等)	長期	必要	箇所	計画													
案内	道路から出入口の場所がわかる案内表示を設置する。	実施時期・方法検討中	必要	箇所	計画													
案内	視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮した案内を充実する。(触知案内図等)	長期	必要	箇所	計画													
心のバリアフリー	指定管理者と調整し、多様な利用者への適切な対応を行う。	随時対応・定期実施	—	—	計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			事業については、指定管理者との協議の上実施する。															
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			案内表示は指定管理者が作成し設置。															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			   															

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—10

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄														
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ														
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市														
3. 事業区間		道路管理者	—														
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—														
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市新栄町1-2-12														
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況				
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容			規模		実施時期							事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期	
出入口	グレーチングを目の細かいものに改良する。(出入口、エレベーター前等)	中期	4	箇所	計画												
					変更												
					実績												
トイレ (共通)	高齢者、障害者等が利用しやすいトイレ (多機能と一般の両方) に改修する。(十分な広さの確保、手すりの設置等)	長期	1	箇所	計画												
					変更												
					実績												
案内	見やすく、わかりやすい案内表示を設置する。(トイレ案内表示の拡大等)	短期	1	箇所	計画												
					変更												
					実績												
案内	案内表示とあわせて点字を設置する。	随時対応・定期実施	—	—	計画												
					変更												
					実績												
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	—	—	計画												
					変更												
					実績												
					計画												
					変更												
					実績												
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—														
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			案内の「案内表示・点字」と「こころのバリアフリー」の継続事業について随時対応・実施しました。														

【推進管理シート】建築物特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業

[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号： 建築物—11

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	茅ヶ崎市勤労市民会館																	
2. 事業主体	すべて	茅ヶ崎市																	
3. 事業区間	道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市新栄町13-32																	
6. 事業計画及び事業実施状況	すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況							
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可		具体的な事業内容			規模		実施時期							事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了			
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期			
建物内通路	主要な通路は、モノや設備などで狭くならないように配慮する。(120cm以上)	随時対応・定期実施	—	—	計画														継続
駐車場	車いす使用者用駐車施設の幅を確保する。(350cm以上)	随時対応・定期実施	—	—	計画														継続
駐輪場	駐輪場の整理・整頓を行う。	随時対応・定期実施	—	—	計画														継続
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	—	—	計画														継続
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等	勤労市民会館は茅ヶ崎市が設置し、指定管理者の民間事業者が管理運営を行っているため、実施に際しては協議が必要。																		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—12

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄															
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎市青少年会館															
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市青少年会館															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市十間坂3丁目5-37															
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画							事業実施状況								
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期					事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了						
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30			R1	R2	R3	R4	R5	検討中
建物内通路	主要な通路は、物や設備などで狭くならないように配慮する。(120cm以上)	随時対応・定期実施	主要な通路は、物や設備などで狭くならないように配慮する。(120cm以上)	—	—	計画												継続
多機能トイレ	高齢者、障害者等が利用しやすい多機能トイレ(広い空間、開閉しやすい扉、手すり、乳幼児用ベッド、オストメイト対応設備)に改善する。	長期	高齢者、障害者等が利用しやすい多機能トイレ(広い空間、開閉しやすい扉、手すり、乳幼児用ベッド、オストメイト対応設備)に改善する。	3	箇所	計画												オストメイト対応設備設置は大規模改修時にあわせ検討する。
案内	見やすく、わかりやすい案内表示を設置する。(弱視・色弱者に配慮した色使い等)	長期	見やすく、わかりやすい案内表示を設置する。(弱視・色弱者に配慮した色使い等)	必要	箇所	計画												敷地内の案内表示や掲示物を設置する場合は、様々な配慮をする。
案内	道路境界から建物内の施設案内、エレベーターや階段前などに視覚障害者誘導用ブロックを設置する。(JIS規格への適合、路面との輝度比確保)	長期	道路境界から建物内の施設案内、エレベーターや階段前などに視覚障害者誘導用ブロックを設置する。(JIS規格への適合、路面との輝度比確保)	1	箇所	計画												必要箇所には、設置されているが、大規模改修時にあわせより細かく見直しをする。
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	—	—	計画												課内会議などの時に勉強会を実施する。
心のバリアフリー	施設の使いやすさを保つための維持管理に配慮する。	随時対応・定期実施	施設の使いやすさを保つための維持管理に配慮する。	—	—	計画												北側正面玄関のアーケードの電球をすべてLED電球に交換したことにより明るさが増し、安全性が高まった。R3年度は老朽化に伴うエレベーター改修工事により、音声案内・手すりの位置・操作ボタン点字等をより使いやすくしたとともに安全性を高めた。
心のバリアフリー	筆談用具の設置や設置を示す案内の掲示を検討する。	短期	筆談用具の設置や設置を示す案内の掲示を検討する。	1	箇所	計画												案内をカウンターに掲示した。
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—															
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>身体障害者用駐車場への看板設置</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>エレベーターへの案内表示</p>  </div> </div>															

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—30

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎公園体験学習センター																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎公園体験学習センター																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市中海岸三丁目3番9号																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
全体	複合施設整備にあわせて、施設のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化を図る。	中期	(仮称) 茅ヶ崎公園体験学習施設整備にあわせて、施設のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化を図る。	—	—	計画												バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した新施設が竣工し、平成31年1月に開館した。	●
敷地内通路	利用者などの駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないように配慮する。	随時対応・定期実施	利用者などの駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないように配慮する。	—	—	計画												平成31年1月5日に海岸青少年会館と福祉会館に代わる施設として体験学習センターが開館したことにより変更	継続
建物内通路	主要な通路は、物や設備などで狭くならないように配慮する。(120cm以上)	随時対応・定期実施	主要な通路は、物や設備などで狭くならないように配慮する。(120cm以上)	—	—	計画												平成31年1月5日に海岸青少年会館と福祉会館に代わる施設として体験学習センターが開館したことにより変更	継続
建物内通路	エレベーターの周囲には物を置かず、乗降する車いすがスムーズに通行できる空間を確保する。(150cm角以上)	随時対応・定期実施	エレベーターの周囲には物を置かず、乗降する車いすがスムーズに通行できる空間を確保する。(150cm角以上)	—	—	計画												平成31年1月に開館した新施設にエレベーターを設置。車いす等の乗降に影響が出ないよう継続的に取り組む。	継続
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	—	—	計画												平成31年1月5日に海岸青少年会館と福祉会館に代わる施設として体験学習センターが開館したことにより変更	継続
心のバリアフリー	施設の使いやすさを保つための維持管理に配慮する。	随時対応・定期実施	施設の使いやすさを保つための維持管理に配慮する。	—	—	計画												平成31年1月5日に海岸青少年会館と福祉会館に代わる施設として体験学習センターが開館したことにより変更	継続
						計画													
						変更													
						実績													
						計画													
						変更													
						実績													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>1階トイレ(男子、女子、障害者)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>エレベーター</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>障害者、妊産婦等の優先駐車場</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>屋外(1階相当)から地階への</p> </div> </div>																

【推進管理シート】建築物特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号： 建築物—14

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	ちがさき市民活動サポートセンター																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎3丁目2番7号																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期			
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	—	—	計画													月1回実施している定期連絡会等において、利用状況や対応等を確認する。	継続
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—																

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—15

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎駅南口子育て支援センター																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市共恵1—1—5 永島ビル2階																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	—	—	計画												定期的に係員の意識の向上を促し、必要に応じて研修等の対応を行う	継続
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—16

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	茅ヶ崎市社会福祉協議会																	
2. 事業主体	すべて	茅ヶ崎市																	
3. 事業区間	道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市新栄町1-3-44 さがみ農協茅ヶ崎ビル2階																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画														事業実施状況		
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期			
受付・窓口	車いす使用者の利用に配慮した受付カウンターを設置する。	短期	1	台	計画														
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	—	—	計画													職員会議等で周知する等、教育を実施している。	継続
その他	パンフレットなど利用者向けの資料のうち必要性の高いものは、車いす使用者の利用に配慮した高さに配置する。	随時対応・定期実施	—	—	計画													定期的に職員が巡回し、パンフレットについて、高さ・取りやすさ等について確認している。	継続
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			 <p>高さ調整可能なカウンターを導入した。</p>																

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—17

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎駅北口子育て支援センター																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市新栄町13-44 さがみ農協ビル3階																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	—	—	計画												定期的に係員の意識の向上を促し、必要に応じて研修等の対応を行う	継続
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—18

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎市老人福祉センター																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市新栄町13-44																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-			検討中	随時・定期
出入口	出入口のドアは、危険防止のため、ドアの反対側の様子がわかるような窓を設ける。	長期	—	—	計画													賃借物件であるため、建物所有者（さがみ農業協同組合）へ情報提供することに努める。	
階段	両側に手すりを設置する。	長期	—	—	計画													階段の手すりは両側に設置されている	●
一般トイレ	洋式や子供用便座、手すり、少し広い便房など使いやすい便房を増やす。（機能分散）	長期	—	—	計画													洋式トイレは平成29年度1基設置。和式トイレの洋式化は令和元年度に完了。	●
案内	視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮し、音や案内表示、文字による案内を充実する。	長期	—	—	計画													案内板や会議室の標識等の文字を大きくし、高齢者が遠くからでも認識できるよう配慮している。また、視覚障害者が案内を確認できるように、必要箇所に点字パネルを設置している。音による案内は、農協ビル全体で協議する必要があり、現在未着手である。	継続
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			老人福祉センターは賃貸物件であるため、事業の実施にあたっては建物所有者（さがみ農業協同組合）と十分に協議し、調整を図る必要がある。																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—19

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎市ファミリー・サポート・センター																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市新栄町13—44 さがみ農協ビル2階																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	—	—	計画												定期的に係員の意識の向上を促し、必要に応じて研修等の対応を行う	継続
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

**【推進管理シート】建築物特定事業**

番号： 建築物—20

**特定事業等の実施時期凡例**

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎市立病院																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市立病院																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市本村5—1 5—1																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画											事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容			規模		実施時期							事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了		
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期			
出入口	視覚障害者等が出入口の場所を認識できるように、盲動鈴など音による案内を設置する。	実施時期・方法検討中	必要	個	計画														
敷地内通路	JIS規格に適合し、路面との色の違いがはっきりした視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	実施時期・方法検討中	必要	箇所	計画														
エスカレーター	下りエスカレーターを安全に利用できる速度に調整する。	実施時期・方法検討中 長期	1	箇所	計画													利用状況等を見極めつつ、速度調整の検討を行い、毎年度のメンテナンス時に速度調整の確認を行っている。 速度調整設定開始：H20年6月	●
一般トイレ	一般トイレに洋式を増設する。	短期	1	箇所	計画													平成28年3月に実施。	●
受付・窓口	視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮し、音声や案内表示、パイプレーター等で順番を知らせるシステムを導入する。	長期	必要	個	計画														
駐車場	車いす使用者用駐車施設を増設する。	実施時期・方法検討中	必要	箇所	計画														
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	—	—	計画													窓口業務等を行っている委託業者で、年1回研修を実施している。	継続
心のバリアフリー	高齢者、障害者等の施設利用をサポートするボランティアを配置する。	随時対応・定期実施	—	—	計画													ボランティアで対応している。(各所受付への案内、入院患者への本の貸し出し(移動図書)→新型コロナウイルス感染防止の観点から一時的に中止)	継続
その他	夜間出入における十分な照度を確保する。	短期	必要	箇所	計画													平成29年度にLED化した。	●
その他	待合ロビーに車いす使用者が待機できるスペースを設置する。	短期	1	箇所	計画													エントランスのレイアウト変更により実施した。	●
その他	待合ロビー等必要な箇所に高い椅子(又は高さ調整可能な椅子)を設置し、膝が悪い人等が優先的に利用する旨を表記する。	中期	必要	箇所	計画													待合いロビー等に設置している椅子の経年劣化が進行しており、椅子の入れ替えに合わせて、当該事業を計画してまいります。	継続
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			医療的な視点からの検討が必要である。																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物—21

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎中央病院																
2. 事業主体		すべて	医療法人社団 康心会 茅ヶ崎中央病院																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・定期実施	—	—	計画													・1回/2ヶ月の職員研修会を実施による職員教育の継続。 ・院内会議（業務改善委員会・接遇向上委員会・運営管理会議）および全体朝礼1回/月による議論・検討・周知	継続
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—																




**【推進管理シート】建築物特定事業**

番号：建築物—23

**特定事業等の実施時期凡例**

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

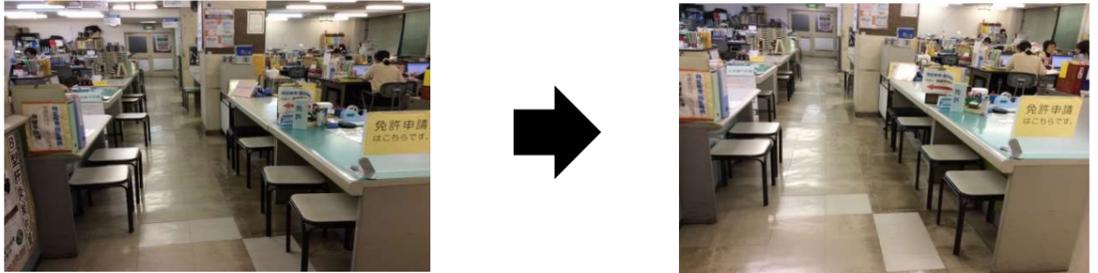項目		該当事業者	記入欄														
1. 施設名、路線名	すべて	茅ヶ崎市保健所															
2. 事業主体	すべて	茅ヶ崎市保健所保健企画課															
3. 事業区間	道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—															
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎1—8—7															
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画								事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期						事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了				
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1			R2	R3	R4	R5
建物内通路	主要な通路は、通行の妨げになる物品等を置かないように配慮する。	随時対応・定期実施	主要な通路は、通行の妨げになる物品等を置かないように、随時職員が確認する。	—	—	計画											
						変更											
						実績											
						計画											
						変更											
						実績											
						計画											
						変更											
						実績											
						計画											
						変更											
						実績											
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			 <p>通路を拡幅するために、カウンターを10cm程度移動させた。</p>														

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—24

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R2年度に実施する事業 [長期]R3年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R2年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎郵便局																
2. 事業主体		すべて	日本郵便株式会社																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市新栄町13-20																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
出入口	視覚障害者等が出入口の場所を認識できるように、盲動鈴など音による案内を設置する。	実施時期・方法検討中	2	箇所	計画													施設出入口のすぐ傍に国道1号線横断用の歩行者用信号機が設置されている。現状で盲動鈴を設置した場合、発信音はその信号の盲動鈴と聞き間違えられるケースも考えられ、それに伴う誤横断で交通事故の発生等もあり得るため、設置を見送ることとした	●
敷地内通路	道路管理者と連携し、道路から施設出入口まで連続した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	短期	1	箇所	計画													最寄りの駅（茅ヶ崎駅）から施設出入口までの誘導用ブロックが設置済みであるが、お客さま用駐車場から施設出入口までの誘導用ブロックに未設置箇所があるため、継続検討としたい。	継続
建物内通路	主要な通路における有効幅員を確保する。(120cm以上)	中期	2	箇所	計画													施設内部の通路で有効幅員が確保できているが、車いす利用者のトイレまでの通路が未整備のため、継続検討としたい	継続
駐車場	介助が必要な方が駐車場から係員を呼び出せるよう、わかりやすい場所にインターホンを設置する。	実施時期・方法検討中	2	箇所	計画													お客様駐車場側に部外者用のインターホンが設置済みで必要時には社員の呼び出しもできるため、完了	●
ATM	車いす使用者の利用に配慮したATMを設置する。	実施時期・方法検討中	1	台	計画													車椅子利用者に配慮したATMに交換済みのため、完了	●
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			—																

【推進管理シート】建築物特定事業

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27~29年度に実施する事業 [中期]H30~R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

番号： 建築物—25

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	ラスカ茅ヶ崎																	
2. 事業主体	すべて	湘南ステーションビル株式会社																	
3. 事業区間	道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市元町1番1号																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期							事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了			
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期			
出入口	駅連絡通路の出入口付近は、施設利用者の移動を妨げることがない十分なスペースを確保する。	短期	1	箇所	計画	■												増築工事により駅改札メインエントランス前を拡張した。	●
エレベーター	エレベーターを増設する。	短期	2	基	計画	■												駅自由通路前、南口側にエレベーターを新設した。	●
階段	両側に手すりを設けるとともに、段を突き出させず、段鼻の色を強調する、点字で行先を表示するなど、安心して利用できるよう配慮する。	短期	1	箇所	計画	■												客用階段の両側に手すりを設置。段の色をわかりやすく強調した。	●
トイレ (共通)	多機能トイレ及び一般トイレを増設する。	短期	5	箇所	計画	■												3~7階に男女トイレ、3・4・6階にマルチトイレ、5階に授乳室を新設。	●
駐輪場	駐輪場を増設する。	短期	306	台	計画	■												既存の北口駐輪場486台に加え南口に新設駐輪場306台を新設。	●
心のバリアフリー	高齢者、障害者等の施設利用をサポートする係員 (介助士、手話通訳等) をインフォメーション等に配置する。	随時対応・定期実施	—	—	計画	■												サポート人員体制を見直し、必要に応じ筆談による対話を行い快適に利用できる環境を構築する。	継続
その他	ベンチを増設する。	短期	5	箇所	計画	■												各フロアに休憩スペースを増設した。	●
その他	車いすでも利用しやすい幅の広いレジレーンを設け、優先して利用できるように配慮する。	短期	1	箇所	計画	■												1階 食料品共同レジのレーン幅を広げた。	●
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			  																

3階 メインエントランス

1階 南口エレベーター

3階 メインエントランス横エレベーター

9.その他  
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



客用階段



南口 駐輪場入口



1階 集中レジ 広めのゾーン



1階 集中レジ レジ横スペース



3階 休憩スペース




4階 休憩スペース



5階 休憩スペース



5階 休憩スペース

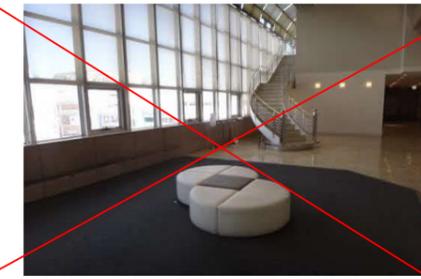

~~6階 休憩スペース~~  
現在は「レストラン」として使用

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—26

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄															
1. 施設名、路線名	すべて	ヤマダ電機ダイクマテックランド茅ヶ崎店 →ヤマダデンキ	LABI LIFE SELECT 茅ヶ崎店 (名称変更)															
2. 事業主体	すべて	株式会社 ヤマダデンキ																
3. 事業区間	道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市新栄町12—3																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容			規模		実施時期						事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了		
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期		
出入口	介助が必要な人が係員を呼び出せるよう、わかりやすい場所へのインターホンの設置を検討する。	短期	1	箇所	計画												令和3年11月26日新築OPEN 該当項目無	●
建物内通路	危険な箇所や案内誘導が必要な箇所には部分的に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。(エレベーターや階段の手前等)	実施時期・方法検討中	必要	箇所	計画												同上	●
エレベーター	エレベーターに点字を設置する。	短期	各階	—	計画												同上	●
多機能トイレ (2階西側)	多機能トイレの床面の排水勾配を改善する。	長期	—	—	計画												同上	●
一般トイレ	一般トイレに洋式や子供用便座、手すり、少し広い便房など使いやすい便房を増やす。(機能分散)	長期	—	—	計画												同上	●
駐車場	駐車場出入口のスロープを車いす使用者等が安全に移動できるように改善する。(段差改善等)	短期	1	箇所	計画												同上	●
駐輪場	駐輪場の整理整頓を行う。	随時対応・定期実施	1	箇所	計画												同上	●
案内	ユニバーサルデザインのサイン計画に見直し、見やすく、わかりやすい案内表示に改善する。	中期	—	—	計画												同上	●
案内	多機能トイレに関する案内表示を設置する。	短期	1	箇所	計画												同上	●
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【推進管理シート】建築物特定事業

特定事業等の実施時期凡例

【短期】H27～29年度に実施する事業 【中期】H30～R4年度に実施する事業 【長期】R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 【実施時期・方法検討中】R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 【随時対応・定期実施】随時、又は定期的に実施する事業

番号：建築物—27

項目		該当事業者	記入欄																	
1. 施設名、路線名	すべて	イトーヨーカドー茅ヶ崎店																		
2. 事業主体	すべて	株式会社カギサン、株式会社イトーヨーカ堂																		
3. 事業区間	道路管理者	—																		
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																		
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市新栄町11-8																		
6. 事業計画及び事業実施状況	すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画																		
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			事業実施状況																	
項目	事業内容	実施時期	具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了			
				数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期	
出入口	関係者と協議し、北側・南側出入口のスロープや段差を改善する。	実施時期・方法検討中	関係者と協議し、北側・南側出入口のスロープや段差を改善する。	2	箇所	計画													スロープ設置済み。	●
出入口	北側・南側出入口の扉のうち、それぞれ1箇所は自動ドアを設置する。	長期	北側・南側出入口の扉のうち、それぞれ1箇所は自動ドアを設置する。	2	箇所	計画													・南側入口はアンバードアのみ。 ・東側入口2カ所、北側入口は自動ドア有り	
建物内通路	危険な箇所や案内誘導が必要な箇所には部分的に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。(エレベーターや階段の手前等)	長期	危険な箇所や案内誘導が必要な箇所には部分的に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。(エレベーターや階段の手前等)	—	—	計画													検討中。	
建物内通路	主要な通路は、モノや設備などで狭くならないように配慮する。(120cm以上)	随時対応・定期実施	主要な通路は、モノや設備などで狭くならないように配慮する。(120cm以上)	—	—	計画													イトーヨーカドー区画内通路は随時修正。	継続
エレベーター	エレベーターに点字を設置する。	短期	エレベーターに点字を設置する。	1	台	計画													検討中。	
エレベーター	障害者等が利用しやすい構造に配慮した設備に改修する。(十分な広さ、わかりやすいボタン、足下まで見える鏡の設置、音声案内、手すり、車いす用押しボタンなど)	長期	障害者等が利用しやすい構造に配慮した設備に改修する。(十分な広さ、わかりやすいボタン、足下まで見える鏡の設置、音声案内、手すり、車いす用押しボタンなど)	1	台	計画													検討中。	
階段	段鼻の色を強調したデザインに改善する。	実施時期・方法検討中	段鼻の色を強調したデザインに改善する。	2	箇所	計画													検討中。	
トイレ(共通)	高齢者、障害者等が利用しやすい多機能トイレ(広い空間、手すり、乳幼児用ベッド、オストメイト対応設備)に改修、増設する。	長期	高齢者、障害者等が利用しやすい多機能トイレ(広い空間、手すり、乳幼児用ベッド、オストメイト対応設備)に改修、増設する。	4	箇所	計画													4階に1箇所設置済み。	
駐車場(ちがさきパーキング)	駐車場と道路の間の段差を解消する。	長期	駐車場と道路の間の段差を解消する。	2	箇所	計画													実施済み。	●
駐車場(ちがさきパーキング)	駐車場の出入口付近に車いす利用者用駐車施設や多機能トイレが設置されていることがわかる案内表示を設置する。	短期	駐車場の出入口付近に車いす利用者用駐車施設や多機能トイレが設置されていることがわかる案内表示を設置する。	2	箇所	計画													表示実施済み	●
駐車場(ちがさきパーキング)	車いす利用者用駐車施設及び高齢者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、利用者への啓発を行う。(チラシ配布等)	随時対応・定期実施	車いす利用者用駐車施設及び高齢者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、利用者への啓発を行う。(チラシ配布等)	—	—	計画													見やすいよう表示を拡大し実施済み	継続
駐車場(ちがさきパーキング)	車いす利用者用駐車施設及び高齢者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、路面の塗装を行う。	長期	車いす利用者用駐車施設及び高齢者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、路面の塗装を行う。	1	箇所	計画													検討中	
駐車場(ちがさきパーキング)	十分な照度を確保する。	長期	十分な照度を確保する。	—	—	計画													2020年9月全フロアー、トイレ、階段等LEDに変更済	●
駐車場(ちがさきパーキング)	聴覚障害者が緊急時に連絡できるように、音声以外の伝達手段(モニターやメールでの対応等)を確保する。	長期	聴覚障害者が緊急時に連絡できるように、音声以外の伝達手段(モニターやメールでの対応等)を確保する。	—	—	計画													現在対応が出来ていません。	
案内	見やすく、わかりやすい案内表示に改善する。(弱視・色弱者に配慮した色使い等)	中期	見やすく、わかりやすい案内表示に改善する。(弱視・色弱者に配慮した色使い等)	—	—	計画													店内表示の見直しの際に配慮した形式に変更を検討	
案内	介助が必要な方への対応を充実する。(出入口へのインターホンの設置、道路からサービスカウンターまで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置等)	長期	介助が必要な方への対応を充実する。(出入口へのインターホンの設置、道路からサービスカウンターまで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置等)	—	—	計画													イトーヨーカドー「お買い物介助サービス」で実施中	
心のバリアフリー	高齢者、障害者等の施設利用をサポートする係員(介助士等)を配置する。	長期	高齢者、障害者等の施設利用をサポートする係員(介助士等)を配置する。	—	—	計画													介助士の配置はできていないが、従業員が対応中	継続
その他	車いすでも利用しやすい幅の広いレジレーンを設け、優先して利用できるように配慮する。	実施時期・方法検討中	車いすでも利用しやすい幅の広いレジレーンを設け、優先して利用できるように配慮する。	—	—	計画													3番レジ「思いやりレジ」1箇所設置	●
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<p style="text-align: center;">駐車場への案内表示</p> 																	

【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物—28

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄															
1. 施設名、路線名		すべて	イオン茅ヶ崎中央店															
2. 事業主体		すべて	三井住友信託銀行株式会社															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎3丁目5-16															
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了	
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-			検討中
駐輪場	利用者などの駐輪が出入口や視覚障害者誘導用ブロック、歩行空間などを遮らないように駐輪場を改良する。	中期	利用者などの駐輪が出入口や視覚障害者誘導用ブロック、歩行空間などを遮らないように駐輪場を改良する。	—	—	計画	■										ライン設置による駐輪スペースの明確化及び注意喚起看板の設置	●
トイレ (共通)	おむつ交換台を増設する。	短期	おむつ交換台を増設する。	—	—	計画											トイレ改装等に合せて順次実施予定	
駐車場	車いす利用者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、路面の塗装や国際シンボルマークをわかりやすく表示する。	短期	車いす利用者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、路面の塗装や国際シンボルマークをわかりやすく表示する。	—	—	計画	■										左記に加えて駐車場内の横断歩道の塗装をきれいにする。	●
案内	案内表示を多言語化する。(フロアガイド等)	中期	案内表示を多言語化する。(フロアガイド等)	—	—	計画	■										店内の案内表示に中国語を順次追加する。 ⇒改装予定の延期のため時期変更	●
案内	エレベーターの名称をわかりやすいものに変更する。	中期	エレベーターの名称をわかりやすいものに変更する。	—	—	計画		■									南北エレベーター標記実施	●
その他	売場や一般トイレなどに、非常事態を聴覚障害者に知らせることができるフラッシュライト等の設置を検討する。	短期	売場や一般トイレなどに、非常事態を聴覚障害者に知らせることができるフラッシュライト等の設置を検討する。	—	—	計画			■								トイレ改装等に合せて順次導入予定	
						計画												
						変更												
						実績												
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—															
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—29

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄															
1. 施設名、路線名		すべて	イオン茅ヶ崎店（イオンスタイル湘南茅ヶ崎）															
2. 事業主体		すべて	イオンリテール株式会社イオン茅ヶ崎店															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長（m）		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎2—7—71 建築物所有者：日本精麦株式会社															
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況					
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容			規模		実施時期						事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了		
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期		
出入口	介助が必要な人が係員を呼び出せるよう、出入口のわかりやすい場所にインターホンを設置する。	実施時期・方法検討中	—	—	計画	■											出入口改装時に改善予定【改装時期未定】	継続
出入口	営業時間内はいつでもエレベーターが利用できるように配慮する。		—	—	計画				■								(営業時間中 エレベーターは使用可能です)	●
建物内通路	危険な箇所や案内誘導が必要な箇所には部分的に視覚障害者誘導用ブロックを設置し、自動音声などで危険を知らせる。(エレベーターや階段の手前等)	実施時期・方法検討中	—	—	計画				■								製氷機箇所では危険アナウンス、エスカレーター付近では注意喚起の放送を実施中。出入口については今後検討。	継続
エレベーター	車いす用押しボタン（通常より長くドアが開くもの）を車いす使用者が利用しやすい高さに変更する。		—	—	計画					■							エレベーターの開閉時間は最長に設定、車椅子利用でも余裕を持って利用出来る状態です。	●
エレベーター	ボタンを浮き文字に改善する。	実施時期・方法検討中	—	—	計画	■											エレベーター更新時に改善予定【更新時期未定】一部実施済。	継続
エレベーター	エレベーター内に到着階等を知らせる音声案内を設置する。		—	—	計画					■							到着フロアを音声でご案内しております。	●
トイレ（共通）	多機能トイレ及び洋式トイレを増設する。		—	—	計画	■											平成27年上期実施済 ・1階フードコート横に多機能トイレを新設（オストメイトも設置） ・トイレ案内表示を変更 ・和式トイレを洋式トイレに変更（19基） ・洋式トイレに温水洗浄便座を設置	●
案内	トイレにある案内表示を改善する。（高さ、点字の設置等）		—	—	計画	■											平成27年9月のリニューアルオープンで実施	●
案内	売場の配置やトイレ、駐車場などについて、視認性が良くわかりやすい案内表示への改善及び増設をする。		—	—	計画	■											同上	●
駐車場	制限車高を超える福祉車両用の駐車施設を屋外の施設出入口付近に設置し、わかりやすく表示する。	実施時期・方法検討中	—	—	計画				■								常設平面駐車場がない為、臨時停車スペースを県道側に確保し、お申し出の際は対応させていただいております。	継続
駐車場	車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、シンボルマークをわかりやすく塗装し、看板を設置する。		—	—	計画				■								平成27年9月のリニューアルオープンで実施（店舗4階は28年3月）	●
その他	十分な照度を確保する。（店内や駐車場、トイレなど）		—	—	計画	■											平成27年9月のリニューアルオープンで実施	●

7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

平成28年1月28日に施設点検を開催

上記以外で、以下の取組を実施。  
・2階正面入口前の駐輪場を移設して、障害物なく出入りできるように改善  
・食品レジの通路幅を2倍に拡大  
・休憩スペースの拡幅（1階フードコートスペースを増設、児童用机・椅子の設置）



多機能トイレの増設・案内表示の改善



和式トイレを洋式トイレに変更



売場の配置表示の変更

9. その他  
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



車いす使用者用駐車施設のシンボルマークの塗装



照明器具の改修による照度の確保



2階正面入口前



幅広レジレーン



1階フードコートスペース

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—23

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	島忠家具ホームセンター茅ヶ崎店																	
2. 事業主体	すべて	株式会社島忠																	
3. 事業区間	道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市本村4—6—51																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画														事業実施状況		
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期			
敷地内通路	舗装のがたつきを改善する。	短期	必要	箇所	計画													平成28年度中に施工予定。	●
建物内通路	主要な通路は、物や設備などで狭くならないように配慮する。(120cm以上)	随時対応・定期実施	必要	箇所	計画													避難通路として災害時に支障がないようにする。	継続
エレベーター	エレベーターの設置位置について、見やすく、わかりやすい案内表示を設置する。	随時対応・定期実施	2	箇所	計画													店舗従業員により矢印などを表示し、見やすい場所に掲示する。	●
階段	手すりを改善するなど安心して利用できるよう配慮する。	実施時期・方法検討中	必要	箇所	計画													出入口付近の階段から設置していく。令和2年度中を目標。	●
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<ul style="list-style-type: none"> <li>・外売場前から舗装又段差を解消しました。(現場確認済)</li> <li>・駐車場に一部へコミが確認されたため、平成30年1月に実施</li> <li>・平面駐車場入り口に陥没箇所があり、危険のため、令和3年10月に大規模工事を実施した</li> <li>・令和4年4月に店長が従業員に体調不良のお客様には車いすを勧める教育を行った</li> <li>・令和4年4月に外売り場の路面ひび割れ・段差補修を行った</li> </ul>																

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—31

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名	すべて	フレスポ茅ヶ崎																	
2. 事業主体	すべて	大和リース株式会社																	
3. 事業区間	道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—																	
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市矢畑620-1																	
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画														事業実施状況		
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	検討中	随時・定期			
建物内通路	各店舗の主要な通路は、モノや設備などで狭くならないように配慮する。(120cm以上)	随時対応・定期実施	—	—	計画														
					変更														
					実績														
トイレ	多機能トイレにオストメイト対応設備を設置する。	実施時期・方法検討中	2	箇所	計画													テナント専用区画内のトイレの為、テナントと調整中。	
					変更														
					実績														
駐車場	車いす利用者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、路面の塗装や国際シンボルマークをわかりやすく表示する。	短期	2	箇所	計画													現状で不適切な利用は確認されていないため、経過観察とする。	
					変更														
					実績														
駐車場	安全な歩行空間を確保する。(休日の誘導員増員、平日の誘導員設置等)	実施時期・方法検討中	1	箇所	計画													現状の誘導員数である程度の安全は確保されているため、経過観察とする。	
					変更														
					実績														
案内	トイレの設置場所がわかる案内表示を充実する。	実施時期・方法検討中	2	箇所	計画													上記、トイレ改修に併せて実施予定とする。	
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			テナント専用区画内の項目については、弊社単独判断で進めることができないので、テナントとの了承、調整、協力が必要である。																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】建築物特定事業

番号：建築物—32

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	東横INN湘南茅ヶ崎駅北口																
2. 事業主体		すべて	株式会社東横イン																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目2-5 3																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容			規模		実施時期							事業に関する補足や検討状況、変更点など		完了		
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期			
出入口	視覚障害者等が出入口の場所を認識できるように、盲動鈴など音による案内を設置する。	長期	1	箇所	計画													未完了	
エレベーター	エレベーターの周囲には物を置かず、乗降する車いすがスムーズに通行できる空間を確保する。(150cm角以上)	短期	1	箇所	計画													看板を移動させて空間を確保した。	●
トイレ	1階トイレの案内表示を改善する。(男女のわかりやすさ、障害特性に応じた利用への配慮等)	長期	2	箇所	計画													今期のリニューアル時に検討します	
トイレ	トイレの案内に点字を設置する。	短期	2	箇所	計画														●
駐車場	駐車場出入口に車の出入りを歩行者に知らせるための表示灯の設置を検討する。	中期	1	箇所	計画													未定	
心のバリアフリー	車いす使用者の利用に配慮した設備等の設置や配置を検討する。	長期	—	—	計画													今期リニューアル時に検討します	
					計画														
					変更														
					実績														
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物—33

特定事業等の実施時期凡例

【短期】H27～29年度に実施する事業 【中期】H30～R4年度に実施する事業 【長期】R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 【実施時期・方法検討中】R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 【随時対応・定期実施】随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄														
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎第1駐車場														
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市、公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター（～H27.12.31）、タイムズ24株式会社連合体（H28.1.1～R3.3.31）、 有限会社 メディカルドリーム（R3.6.23～）														
3. 事業区間		道路管理者	—														
4. 道路延長（m）		道路管理者	—														
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁目2番20号														
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況				
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容		規模		実施時期						事業に関する補足や検討状況、 変更点など		完了		
項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・ 定期	
建物内通路	主要な歩行者用通路の有効幅員の確保を検討する。（120cm以上）	短期	4	階	計画		■										茅ヶ崎第1駐車場については、「茅ヶ崎第1駐車場土地活用事業」を実施し、土地を民間事業者へ貸し付けることとし、令和3年3月31日で運営を終了した。新しい建物の供用開始は、令和6年4月1日（予定）となるため、それまでに事業者と事業内容について協議していく。
駐車施設	一般駐車スペース幅の確保を検討する。（250cm以上）	短期	25	台	計画		■										同上
案内	聴覚障害者が緊急時に連絡できるように、音声以外の伝達手段（モニターやメールでの対応等）を確保する。	短期	3	階	計画			■									同上
案内	車が停車していても車いす使用者用駐車施設であることがわかるように、国際シンボルマークを用いた表示を設置する。	短期	2	台	計画		■										同上
心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。	随時対応・ 定期実施	—	—	計画												同上
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等		建物の構造上の制約が多い。また、聴覚障害に関しては、他の施設と同様に長期的な検討が必要である。															
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等		令和2年度実施の「茅ヶ崎第1駐車場土地活用事業」において、令和3年3月31日付けで運営を終了し、新たに民間事業者へ土地を貸し付けることとした。令和4年2月現在、既存建物の解体工事中となり、新しい建物の供用開始は令和6年4月1日を予定している。供用開始までに、事業内容について事業者と協議していくこととする。															

【推進管理シート】都市公園特定事業

番号：都市公園ー1

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	中央公園 (第一カッターきいろ公園)																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2077-12																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画														事業実施状況		
項目	事業内容	実施時期	具体的な事業内容	数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5-	検討中	随時・定期	事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了
園路	平坦な園路を整備する。	中期	出入口部の小補石舗装の一部を、インターロッキング舗装等で整備し、平滑な園路を設ける。	—	—	計画												事業スケジュール見直しのため実施時期を変更	
トイレ	必要な機能を保ち、安心して使えるよう適切に維持管理する。	随時対応・定期実施	公園利用者が安全で快適にトイレを使えるように適切に維持管理する。	—	—	計画												定期的に清掃を実施する。	継続
トイレ	トイレを増設する。	短期	トイレの基数を増やし、利便性の向上とのトイレ不足の解消を図る。	—	—	計画												中央公園管理棟建替え工事により、トイレ数増	●
トイレ	多機能トイレに多目的シートを設置する。	短期	多機能トイレに多目的シートを設置する。	—	—	計画												中央公園管理棟建替え工事により、多目的シート設置	●
駐輪	駐輪スペースを確保する。	実施時期・方法検討中	出入口付近に駐輪スペースの確保を検討する。	—	—	計画												事業スケジュール見直しのため実施時期を変更	
案内	園内における自転車の駐輪や走行が禁止であることを示す案内表示を増設する。	短期	公園の出入口に公園の利用マナーや禁止事項を示したサインを増設する。	—	—	計画												事業スケジュール見直しのため実施時期を変更	
案内	バリアフリー経路や公園施設などについて、見やすく、わかりやすい案内板を設置する。(それぞれの入口付近など)	中期	主要園路や出入口に視覚障害者誘導用ブロックや触知サイン等を設置する。	—	—	計画												事業スケジュール見直しのため実施時期を変更	
休憩施設	ベンチを増設する。	短期	主要園路及び広場にベンチを増設する。	—	—	計画												事業スケジュール見直しのため実施時期を変更	
防災施設	かまどベンチを増設する。	中期	防災機能を備えたかまどベンチを増設する。	—	—	計画												事業スケジュール見直しのため実施時期を変更	
歩行空間	植栽帯撤去により歩道を拡幅する。	中期	植栽帯撤去により歩道を拡幅する。	—	—	計画												事業スケジュール見直しのため実施時期を変更	
歩行空間	歩道拡幅にあわせて、休憩スペース(ベンチ)を設置する。	中期	外周歩道沿いに休憩用スペース(ベンチ)を設ける。	—	—	計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			今後実施予定の詳細設計においても必要に応じて関係者の意見を伺い、事業への反映を検討する。																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			平成30年度 トイレを含む管理棟の建替え工事を実施 令和元年度 既存管理棟の撤去工事を実施 令和3年度 災害用水洗トイレシステム(防災トイレ 4基)の寄贈を受ける																

【推進管理シート】都市公園特定事業

番号：都市公園—2

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	茅ヶ崎公園																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市中海岸3—11483—59																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
トイレ	高齢者、障害者等が利用しやすいトイレに改修する。	長期	高齢者、障害者等が利用しやすいトイレに改修する。	16	基	計画												事業スケジュール見直しのため実施時期を変更	
トイレ	必要な機能を保ち、安心して使えるよう適切に維持管理する。	随時対応・定期実施	公園利用者が安全で快適にトイレを使えるように適切に維持管理する。	—	—	計画												定期的に清掃を実施する。便器の一部や扉の鍵の交換等の修繕を実施した。	継続
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
						計画													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】都市公園特定事業

番号：都市公園—3

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	高砂緑地																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	茅ヶ崎市東海岸北1—10293																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
園路	舗装のがたつきを改善する。	短期	舗装のがたつきを改善する。	—	—	計画												補修を継続的に実施していく	
						変更													
						実績													
園路	JIS規格に適合し、周囲との色の差がはっきりした視覚障害者誘導用ブロックに改修する。	実施時期・方法検討中	JIS規格に適合し、周囲との色の差がはっきりした視覚障害者誘導用ブロックに改修する。	—	—	計画												事業スケジュール見直しのため実施時期を変更	
						変更													
						実績													
案内	見やすく、わかりやすい案内表示を設置する。(全体案内図、バリアフリー経路等)	中期	見やすく、わかりやすい案内表示を設置する。	—	—	計画												事業スケジュール見直しのため実施時期を変更	
						変更													
						実績													
						計画													
						変更													
						実績													
						計画													
						変更													
						実績													
						計画													
						変更													
						実績													
7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等			—																
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			—																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【推進管理シート】その他の事業

番号：その他—1

特定事業等の実施時期凡例

[短期]H27～29年度に実施する事業 [中期]H30～R4年度に実施する事業 [長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業  
 [実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目		該当事業者	記入欄																
1. 施設名、路線名		すべて	サザンビーチちがさき																
2. 事業主体		すべて	茅ヶ崎市（神奈川県）																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長（m）		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 事業計画及び事業実施状況		すべて	茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 特定事業計画										事業実施状況						
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想 ※変更不可			具体的な事業内容	規模		実施時期										事業に関する補足や検討状況、変更点など	完了		
項目	事業内容	実施時期		数量	単位	(年度)	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			検討中	随時・定期
通路	遊歩道の堆砂除去を定期的実施する。	随時対応・定期実施	神奈川県藤沢土木事務所なぎさ港湾課、ボランティア等と連携し、随時遊歩道の堆砂除去を実施する。	—	—	計画												随時堆砂除去を実施している。	継続
通路	「茅ヶ崎サザンC」と遊歩道の接続する部分の段差を解消する。	短期	神奈川県なぎさ港湾課、都市政策課、産業振興課で「茅ヶ崎サザンC」と遊歩道の接続する部分の段差の解消方法を検討し、実施する。	—	—	計画												段差を解消する工事を行った。	●
通路	歩行者が安全に通行できるように、自転車利用者へのルールやマナーなどの注意喚起を促す看板を設置する。	短期	安全対策課と看板設置場所を協議の上、歩行者が安全に通行できるように、自転車利用者へのルールやマナーなどの注意喚起を促す看板を設置する。	—	—	計画												安全対策課と検討中。	
通路	視覚障害者誘導用ブロックを設置する。（茅ヶ崎海岸グランドプランの計画に応じた誘導ルートと連携した配置を検討）	長期	視覚障害者誘導用ブロックを設置する。（茅ヶ崎海岸グランドプランの計画に応じた誘導ルートと連携した配置を検討）	—	—	計画												サイクリングロードの管理者である神奈川県なぎさ港湾課と設置に関して検討中。	
トイレ	常設トイレを設置する。	中期	「茅ヶ崎海岸グランドプラン」に基づき、海岸利用者の利便性を考慮し、常設トイレを設置する。	3	箇所	計画												サザンビーチ西公衆便所をA地区に設置した（乳幼児用ベッド、オストメイト対応設備あり）。今後B、C地区にも設置を検討する。	
休憩施設	休憩用のベンチを設置する。	中期	「茅ヶ崎海岸グランドプラン」に基づき、市民が憩える休憩用のベンチを設置する。	3	箇所	計画												A地区のサザンビーチ西公衆便所に設置。B、C地区にも設置を検討する。	
駐車場	駐車場を増設し、案内を設置する。	長期	漁港老朽化対策事業が終了する平成32年度を目標に漁港背後地に駐車場を整備し、案内を設置する。	—	—	計画												漁港背後地の整備について具体的なスケジュールが決まった段階で、茅ヶ崎市漁業協同組合、海岸づくり推進機構と共に検討を行う。	
駐輪場	駐輪場及びレンタサイクルポートを設置する。	長期	中海岸プール跡地（C地区）に駐輪場、サイクリング拠点の整備を行う。	—	—	計画												サイクリング拠点の整備について海岸づくり推進機構と共に検討中。	
案内	津波情報盤を設置する。（視覚情報の提供）	短期	神奈川県なぎさ港湾課とサザンビーチ周辺で効果的に津波情報を発信できる場所を検討し、津波情報盤を設置する。	1	箇所	計画												神奈川県なぎさ港湾課と検討中。	
その他	貸出のビーチ用車いすの設置を検討する。	実施時期・方法検討中	貸出のビーチ用車いすの設置について海水浴場組合、観光協会と検討する。	—	—	計画												令和5年度の実施に向けて、海水浴場組合、観光協会と検討中。	

7. 事業の実施に際し配慮すべき事項等


整備にあたっては「茅ヶ崎海岸グランドプラン」と整合・連携を図りながら進める必要がある。

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

9. その他  
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

「茅ヶ崎海岸グランドプラン」整備地区の名称について

- A地区: 南湖四丁目の国道南側
- B地区: 中海岸四丁目の国道南側
- C地区: 中海岸三丁目の国道南側
- D地区: 南湖四丁目の国道北側

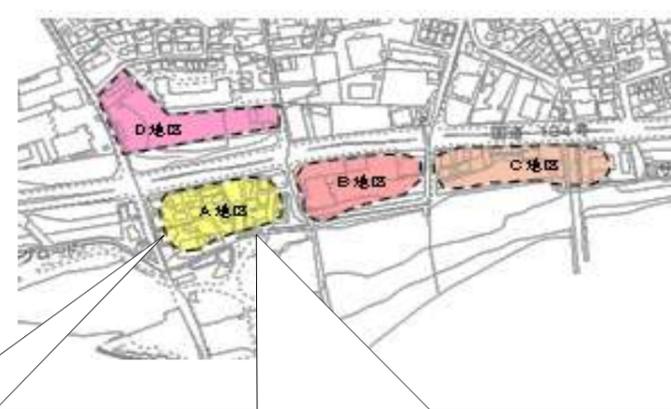

サザンビーチ西公衆便所



茅ヶ崎サザンC段差解消

駐車場及び看板の設置

